

| d   | Texto1     | Nombre de tarea                              | Duración | Comienzo     | Fin          | 0   Semestre 1, 2021   Semestre 2, 2021   Semestre 1, 2022   Semestre 2, 2022   Semestre 1, 2023   Semestre 2, 2023   Semestre 2 |
|-----|------------|--|----------|--------------|--------------|--|
| 89  | s/09       | S/09 – Vigas, Losas Viguetas y Losas Macizas | 4 días   | mié 07/07/21 | lun 12/07/21 | N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M  |
|     | s/10       | S/10 - Columnas/Tabiques                     | 8 días   | mar 13/07/21 | jue 22/07/21 | ■ 0%   |
|     | s/10       | S/10 – Vigas, Losas Viguetas y Losas Macizas | 4 días   | vie 23/07/21 | mié 28/07/21 | • 0%   |
|     | s/11       | S/11 - Columnas/Tabiques                     | 8 días   | jue 29/07/21 | lun 09/08/21 | <b>0%</b>  |
|     | s/11       | S/11 - Vigas, Losas Viguetas y Losas Macizas | 4 días   | mar 10/08/21 | vie 13/08/21 | 0%   |
|     | s/12       | S/12 - Columnas/Tabiques                     | 8 días   | lun 16/08/21 | mié 25/08/21 | 0%   |
|     | s/12       | S/12 – Vigas, Losas Viguetas y Losas Macizas | 4 días   | jue 26/08/21 | mar 31/08/21 | ■ 0%   |
|     | s/13       | S/13 - Columnas/Tabiques                     | 8 días   | mié 01/09/21 | vie 10/09/21 | <b>0</b> %   |
|     | s/13       | S/13 – Vigas, Losas Viguetas y Losas Macizas | 4 días   | lun 13/09/21 | jue 16/09/21 | <b>0</b> %   |
|     | s/14       | S/14 - Columnas/Tabiques                     | 8 días   | vie 17/09/21 | mar 28/09/21 | <b>■ 0</b> %   |
|     | s/14       | S/14 - Vigas, Losas Viguetas y Losas Macizas | 4 días   | mié 29/09/21 | lun 04/10/21 | . 0%   |
| 100 |            | S/15 - Columnas/Tabiques                     | 8 días   | mar 05/10/21 | jue 14/10/21 | 0%   |
|     |            | S/15 - Vigas, Losas Viguetas y Losas Macizas | 4 días   | vie 15/10/21 | mié 20/10/21 | 0%   |
| 101 |            |  |          |              |              |  |
| 102 |            | S/16 - Columnas/Tabiques                     | 8 días   | jue 21/10/21 | lun 01/11/21 | 0%   |
| 103 |            | S/16 - Vigas, Losas Viguetas y Losas Macizas | 4 días   | mar 02/11/21 | vie 05/11/21 | □ 0%<br>□ 0%   |
| 104 |            | S/17 - Columnas/Tabiques                     | 8 días   | lun 08/11/21 | mié 17/11/21 | <b>■ 0%</b>  |
| 105 |            | S/17 – Vigas, Losas Viguetas y Losas Macizas | 4 días   | jue 18/11/21 | mar 23/11/21 | <b>□ 0%</b>  |
| 106 |            | S/18 – Columnas/Tabiques                     | 8 días   | mié 24/11/21 | vie 03/12/21 | ■ 0%   |
| 107 |            | S/18 – Vigas, Losas Viguetas y Losas Macizas | 4 días   | lun 06/12/21 | jue 09/12/21 | 0%   |
|     | s/Terraza  | s/Terraza – Columnas/Tabiques                | 8 días   | vie 10/12/21 | mar 21/12/21 | ■ 0%   |
|     | s/Terraza  | s/Terraza – Vigas y Losas Macizas            | 5 días   | mié 22/12/21 | mar 28/12/21 | <b>0%</b>  |
| 110 |            | 08-ESTRUCTURAS ESPECIALES                    | 258 días | mar 05/01/21 | jue 30/12/21 | 30%  |
|     | s/0000S.S  | s/0000S.S.2 - Escalera                       | 6 días   | mar 05/01/21 | mar 12/01/21 | <b>= 100</b> %   |
|     | s/000S.S.' | s/000S.S.1 - Escalera                        | 4 días   | mar 02/02/21 | vie 05/02/21 | <b>100</b> %   |
|     | s/00P.B.   | s/00P.B Escalera                             | 5 días   | lun 01/03/21 | vie 05/03/21 | 90%  |
| 114 | s/00P.B.   | s/00P.B Muro Medianero lado Salta -1         | 6 días   | lun 18/01/21 | lun 15/02/21 | ∎ :100%  |
| 115 |            | s/00P.B. – Muro Medianero lado Salta –2      | 6 días   | lun 10/05/21 | lun 17/05/21 | <b>0%</b>  |
| 116 | s/00P.B.   | s/00P.B Muro Medianero lado Catamarca        | 6 días   | mar 18/05/21 | mar 25/05/21 | <b>= 0</b> %   |
| 117 | s/01       | S/01 - Escalera                              | 2 días   | mié 17/03/21 | jue 18/03/21 | ı, <b>0</b> %  |
| 118 | s/02       | S/02 – Escalera                              | 2 días   | vie 02/04/21 | lun 05/04/21 | ", 0%  |
| 119 | s/03       | S/03 – Escalera                              | 2 días   | mar 20/04/21 | mié 21/04/21 | ı, <b>0</b> %  |
| 120 | s/04       | S/04 – Escalera                              | 2 días   | jue 06/05/21 | vie 07/05/21 | ı, 0%  |
| 121 | s/05       | S/05 - Escalera                              | 2 días   | lun 24/05/21 | mar 25/05/21 | ' <sub>"</sub> 0%  |
| 122 | s/06       | S/06 – Escalera                              | 2 días   | mié 09/06/21 | jue 10/06/21 | ı, 0%  |
| 123 | s/07       | S/07 - Escalera                              | 2 días   | vie 25/06/21 | lun 28/06/21 | <b>□, 0%</b>   |
| 124 | s/08       | S/08 - Escalera                              | 2 días   | mar 13/07/21 | mié 14/07/21 | ı, <b>0</b> %  |
| 125 | s/09       | S/09 - Escalera                              | 2 días   | jue 29/07/21 | vie 30/07/21 | ı, <b>0</b> %  |
| 126 | s/10       | S/10 - Escalera                              | 2 días   | lun 16/08/21 | mar 17/08/21 | ₁ <sub>■</sub> 0%  |
| 127 | s/11       | S/11 - Escalera                              | 2 días   | mié 01/09/21 | jue 02/09/21 | ı, <b>0</b> %  |
| 128 | s/12       | S/12 - Escalera                              | 2 días   | vie 17/09/21 | lun 20/09/21 | □, 0%  |
| 129 |            | S/13 - Escalera                              | 2 días   | mar 05/10/21 | mié 06/10/21 | ı, <b>0</b> %  |
| 130 |            | S/14 - Escalera                              | 2 días   | jue 21/10/21 | vie 22/10/21 | ı, 0%  |
| 131 |            | S/15 - Escalera                              | 2 días   | lun 08/11/21 | mar 09/11/21 | . 0%   |
|     |            |  |          | mié 24/11/21 |              | 0%   |

|     |           |                                      |          |              |              | Cronograma de trabajos ZOE-   |
|-----|-----------|--------------------------------------|----------|--------------|--------------|---|
|     | Texto1    | Nombre de tarea                      | Duración | Comienzo     | Fin          | 0   Semestre 1, 2021   Semestre 2, 2021   Semestre 1, 2022   Semestre 2, 2022   Semestre 1, 2023   Semestre 2, 2023   Semestre 2, 2023   Semestre 2, 2023   Semestre 2, 2024   Semestre 2, 2025   Semestre 2, 2025   Semestre 2, 2026   Semestre 2, 2026   Semestre 2, 2027   Semestre 2, 2027   Semestre 2, 2028   Semestre |
| 133 | s/17      | S/17 - Escalera                      | 2 días   | vie 10/12/21 | lun 13/12/21 | 10%   |
| 134 | s/18      | S/18 - Escalera                      | 2 días   | mié 29/12/21 | jue 30/12/21 | ı, <b>0</b> %   |
| 135 |           | 09-MAMPOSTERIA Y TABIQUES            | 239 días | lun 24/05/21 | jue 21/04/22 | 0%  |
| 136 | s/0000S.S | s/0000S.S.2 - MAMPOSTERIA            | 10 días  | vie 04/02/22 | jue 17/02/22 | ■ 0%  |
| 137 | s/0000S.S | s/0000S.S.2 - MAMPOSTERIA SUBETACION | 10 días  | mar 01/06/21 | lun 14/06/21 | ■ 0%  |
| 138 | s/000S.S. | s/000S.S.1 - MAMPOSTERIA             | 8 días   | vie 18/02/22 | mar 01/03/22 | ■ 0%  |
| 139 | s/00P.B.  | s/00P.B MAMPOSTERIA                  | 15 días  | mié 02/03/22 | mar 22/03/22 | 0%  |
| 140 | s/00P.B.  | s/00P.B TABIQUES ESTRCUTURA          | 4 días   | vie 25/03/22 | mié 30/03/22 | <b>□ 0</b> %  |
| 141 | s/00P.B.  | s/00P.B TABIQUES EMPLACADO           | 4 días   | vie 08/04/22 | mié 13/04/22 | ■ 0%  |
| 142 | s/01      | S/01 - MAMPOSTERIA                   | 4 días   | mié 23/03/22 | lun 28/03/22 | <b>□ 0</b> %  |
| 143 | s/01      | S/01 - TABIQUES ESTRUCTURA           | 5 días   | jue 31/03/22 | mié 06/04/22 | ■ 0%  |
| 144 | s/01      | S/01 - TABIQUES EMPLACADO            | 5 días   | vie 15/04/22 | jue 21/04/22 | <b>□ 0</b> %  |
| 145 | s/02      | S/02 - MAMPOSTERIA                   | 4 días   | lun 24/05/21 | jue 27/05/21 | <b>□ 0</b> %  |
| 146 | s/02      | S/02 - TABIQUES ESTRCUTURA           | 5 días   | mar 01/06/21 | lun 07/06/21 | <b>■ 0</b> %  |
|     | s/02      | S/02 - TABIQUES EMPLACADO            | 5 días   | mié 16/06/21 | mar 22/06/21 | - 0%  |
| 148 | s/03      | S/03 - MAMPOSTERIA                   | 4 días   | mié 09/06/21 | lun 14/06/21 | _ 0%  |
| 149 |           | S/03 - TABIQUES ESTRCUTURA           | 5 días   | jue 17/06/21 | mié 23/06/21 | - 0%  |
| 150 |           | S/03 - TABIQUES EMPLACADO            | 5 días   | vie 02/07/21 | jue 08/07/21 | - 0%  |
| 151 | s/04      | S/04 - MAMPOSTERIA                   | 4 días   | vie 25/06/21 | mié 30/06/21 | - 0%  |
|     | s/04      | S/04 - TABIQUES ESTRCUTURA           | 5 días   | lun 05/07/21 | vie 09/07/21 | <b>■</b> 0%   |
| 153 | s/04      | S/04 - TABIQUES EMPLACADO            | 5 días   | mar 20/07/21 | lun 26/07/21 | - 0%  |
| 154 | s/05      | S/05 - MAMPOSTERIA                   | 4 días   | mar 13/07/21 | vie 16/07/21 | <b>□</b> 0%   |
| 155 | s/05      | S/05 - TABIQUES ESTRUCTURA           | 5 días   | mié 21/07/21 | mar 27/07/21 | ■ 0%  |
| 156 | s/05      | S/05 - TABIQUES EMPLACADO            | 5 días   | jue 05/08/21 | mié 11/08/21 | ■ 0%  |
| 157 | s/06      | S/06 - MAMPOSTERIA                   | 4 días   | jue 29/07/21 | mar 03/08/21 | - 0%  |
| 158 | s/06      | S/06 - TABIQUES ESTRCUTURA           | 5 días   | vie 06/08/21 | jue 12/08/21 | <b>■ 0</b> %  |
| 159 | s/06      | S/06 - TABIQUES EMPLACADO            | 5 días   | lun 23/08/21 | vie 27/08/21 | <b>™</b> 0%   |
| 160 | s/07      | S/07 - MAMPOSTERIA                   | 4 días   | lun 16/08/21 | jue 19/08/21 | <b>□</b> 0%   |
| 161 | s/07      | S/07 - TABIQUES ESTUCTURA            | 5 días   | mar 24/08/21 | lun 30/08/21 | _ 0%  |
| 162 |           | S/07 - TABIQUES EMPLACADO            | 5 días   | mié 08/09/21 | mar 14/09/21 | ■ 0%  |
| 163 |           | S/08 - MAMPOSTERIA                   | 4 días   | mié 01/09/21 | lun 06/09/21 | ■ 0%  |
| 164 |           | S/08 - TABIQUES ESTRCUTURA           | 5 días   | jue 09/09/21 | mié 15/09/21 | - 0%  |
| 165 |           | S/08 - TABIQUES EMPLACADO            | 5 días   | vie 24/09/21 | jue 30/09/21 | - 0%  |
| 166 | s/09      | S/09 - MAMPOSTERIA                   | 4 días   | vie 17/09/21 | mié 22/09/21 | ■ 0%  |
| 167 |           | S/09 - TABIQUES ESTRUCTURA           | 5 días   | lun 27/09/21 | vie 01/10/21 | ■ 0%  |
| 168 | s/09      | S/09 - TABIQUES EMPLACADO            | 5 días   | mar 12/10/21 | lun 18/10/21 | <b>№</b> 0%   |
| 169 | s/10      | S/10 - MAMPOSTERIA                   | 5 días   | mar 05/10/21 | lun 11/10/21 | ■ 0%  |
| 170 | s/10      | S/10 - TABIQUES ESTRUCTURA           | 5 días   | jue 14/10/21 | mié 20/10/21 | ■ 0%  |
| 171 | s/10      | S/10 - TABIQUES EMPLACADO            | 5 días   | vie 29/10/21 | jue 04/11/21 | ■ 0%  |
| 172 |           | S/11 - MAMPOSTERIA                   | 5 días   | jue 21/10/21 | mié 27/10/21 | <b>□</b> 0%   |
| 173 |           | S/11 - TABIQUES ESTRCUTURA           | 5 días   | lun 01/11/21 | vie 05/11/21 | <b>■ 0</b> %  |
| 174 |           | S/11 - TABIQUES EMPLACADO            | 5 días   | mar 16/11/21 | lun 22/11/21 | - 0%  |
| 175 |           | S/12 - MAMPOSTERIA                   | 5 días   | lun 08/11/21 | vie 12/11/21 | <b>™</b> 0%   |
| 176 | s/12      | S/12 - TABIQUES ESTRUCTURA           | 5 días   | mié 17/11/21 | mar 23/11/21 | <b>™</b> 0%   |

|     |            |                                       |          |                              | 2021.03.04   |
|-----|------------|---------------------------------------|----------|------------------------------|--------------|
|     | Texto1     | Nombre de tarea                       | Duración | Comienzo                     | Fin          |
| 177 | s/12       | S/12 - TABIQUES EMPLACADO             | 5 días   | jue 02/12/21                 | mié 08/12/21 |
| 178 |            | S/13 - MAMPOSTERIA                    | 5 días   | mié 24/11/21                 | mar 30/11/21 |
| 179 |            | S/13 - TABIQUES ESTRUCTURA            | 5 días   | vie 03/12/21                 | jue 09/12/21 |
|     | s/13       | S/13 - TABIQUES EMPLACADO             | 5 días   | lun 20/12/21                 | vie 24/12/21 |
|     | s/14       | S/14 - MAMPOSTERIA                    | 6 días   | vie 10/12/21                 | vie 17/12/21 |
|     | s/14       | S/14 - TABIQUES ESTRCUTURA            | 5 días   | mié 22/12/21                 | mar 28/12/21 |
| 183 |            | S/14 - TABIQUES EMPLACADO             | 5 días   | jue 06/01/22                 | mié 12/01/22 |
|     | s/15       | S/15 - MAMPOSTERIA                    | 6 días   | mié 29/12/21                 | mié 05/01/22 |
|     | s/15       | S/15 - TABIQUES ESTRUCTURA            | 5 días   | lun 10/01/22                 | vie 14/01/22 |
| 186 | _          | S/15 - TABIQUES EMPLACADO             | 5 días   | mar 25/01/22                 | lun 31/01/22 |
|     | _          | S/16 - MAMPOSTERIA                    | 6 días   | jue 06/01/22                 | jue 13/01/22 |
| 188 |            | S/16 - TABIQUES ESTRUCTURA            | 5 días   | mar 18/01/22                 | lun 24/01/22 |
|     |            | S/16 - TABIQUES EMLPACADO             | 5 días   | mié 02/02/22                 | mar 08/02/22 |
| 190 |            | S/17 - MAMPOSTERIA                    | 7 días   | vie 14/01/22                 | lun 24/01/22 |
| 191 |            | S/17 - TABIQUES ESTRCUTURA            | 5 días   | jue 27/01/22                 | mié 02/02/22 |
|     | _          | S/17 - TABIQUES EMPLACADO             | 5 días   | vie 11/02/22                 | jue 17/02/22 |
|     |            | S/18 - MAMPOSTERIA                    | 5 días   | mar 25/01/22                 | lun 31/01/22 |
| 194 |            | S/18 - TABIQUES ESTRCUTURA            | 4 días   | jue 03/02/22                 | mar 08/02/22 |
|     | s/18       | S/18 - TABIQUES EMPLACADO             | 4 días   | vie 18/02/22                 | mié 23/02/22 |
|     |            |                                       | 3 días   | mar 01/02/22                 | jue 03/02/22 |
| 197 | 3, 1011420 | 10-AISLACIONES E IMPERMEABILIZACIONES | 70 días  | mar 08/02/22                 | lun 16/05/22 |
|     | s/Terraza  |                                       | 10 días  | mar 08/02/22                 | lun 21/02/22 |
|     | s/Terraza  |                                       | 10 días  | mar 22/02/22                 | lun 07/03/22 |
|     | _          |                                       | 20 días  | mar 19/04/22                 | lun 16/05/22 |
|     | 5700005.5  | 11-REVOQUES CEMENTICIOS               | 118 días | vie 04/02/22                 | mar 19/07/22 |
| 201 | c /00D B   | s/00P.B Revoque 3en1 Proyectado       | 3 días   | vie 04/02/22<br>vie 15/07/22 | mar 19/07/22 |
|     | s/00P.B.   |                                       |          |                              |              |
|     | s/01       | s/01 - Revoque 3en1 Proyectado        | 3 días   | mar 12/07/22                 | jue 14/07/22 |
|     | s/02       | s/02 - Revoque 3en1 Proyectado        | 3 días   | jue 07/07/22                 | lun 11/07/22 |
|     | s/03       | s/03 - Revoque 3en1 Proyectado        | 4 días   | vie 01/07/22                 | mié 06/07/22 |
|     | s/04       | s/04 - Revoque 3en1 Proyectado        | 4 días   | lun 27/06/22                 | jue 30/06/22 |
|     | s/05       | s/05 - Revoque 3en1 Proyectado        | 4 días   | mar 21/06/22                 | vie 24/06/22 |
|     |            | s/06 - Revoque 3en1 Proyectado        | 6 días   | lun 13/06/22                 | lun 20/06/22 |
|     | s/07       | s/07 - Revoque 3en1 Proyectado        | 6 días   | vie 03/06/22                 | vie 10/06/22 |
|     | s/08       | s/08 - Revoque 3en1 Proyectado        | 6 días   | jue 26/05/22                 | jue 02/06/22 |
|     |            | s/09 – Revoque 3en1 Proyectado        | 6 días   | mié 18/05/22                 | mié 25/05/22 |
|     | s/10       | s/10 - Revoque 3en1 Proyectado        | 7 días   | lun 09/05/22                 | mar 17/05/22 |
| 213 |            | s/11 - Revoque 3en1 Proyectado        | 7 días   | jue 28/04/22                 | vie 06/05/22 |
|     | s/12       | s/12 - Revoque 3en1 Proyectado        | 7 días   | mar 19/04/22                 | mié 27/04/22 |
| 215 | s/13       | s/13 - Revoque 3en1 Proyectado        | 8 días   | jue 07/04/22                 | lun 18/04/22 |
|     | s/14       | s/14 - Revoque 3en1 Proyectado        | 8 días   | lun 28/03/22                 | mié 06/04/22 |
| 217 | s/15       | s/15 - Revoque 3en1 Proyectado        | 8 días   | mié 16/03/22                 | vie 25/03/22 |
| 218 | s/16       | s/16 - Revoque 3en1 Proyectado        | 8 días   | vie 04/03/22                 | mar 15/03/22 |
| 219 | s/17       | s/17 - Revoque 3en1 Proyectado        | 8 días   | mar 22/02/22                 | jue 03/03/22 |
| 220 | s/18       | s/18 – Revoque 3en1 Proyectado        | 8 días   | jue 10/02/22                 | lun 21/02/22 |

|            |           |  |          |              | 2021.03.04   | -Cronograma de trabajos ZOE-  |
|------------|-----------|--|----------|--------------|--------------|---|
| [d         | Texto1    | Nombre de tarea                                      | Duración | Comienzo     | Fin          | 0   Semestre 1, 2021   Semestre 2, 2021   Semestre 1, 2022   Semestre 2, 2022   Semestre 1, 2023   Semestre 2, 2023   Semestre 1, 2023   Semestre 2, 2023   Semestre 1, 2024   Semestre 2, 2025   Semestre 2, 2026   Semestre 2, 2026   Semestre 2, 2026   Semestre 2, 2027   Semestre 2, 2027   Semestre 2, 2028   Semestre |
| 221        | s/Terraza | ' '  | 4 días   | vie 04/02/22 | mié 09/02/22 | <b>□</b> 0%   |
| 222        |           | 12-REVOQUE SECO/YESERIA                              | 221 días | mié 16/06/21 | mié 20/04/22 | 0%  |
| 223        | s/00P.B.  | s/00P.B. – Revoque en sobre perfil Omega             | 2 días   | vie 08/04/22 | lun 11/04/22 | լ ■ 0%  |
| 224        | s/01      | s/01 – Revoque en sobre perfil Omega                 | 4 días   | vie 15/04/22 | mié 20/04/22 | "■ 0%   |
| 225        | s/02      | s/02 – Revoque en sobre perfil Omega                 | 4 días   | mié 16/06/21 | lun 21/06/21 | ■ 0%  |
| 226        | s/03      | s/03 – Revoque en sobre perfil Omega                 | 4 días   | vie 02/07/21 | mié 07/07/21 | <b>"■ 0</b> %   |
| 227        | s/04      | s/04 – Revoque en sobre perfil Omega                 | 4 días   | mar 20/07/21 | vie 23/07/21 | ■ 0%  |
| 228        | s/05      | s/05 – Revoque en sobre perfil Omega                 | 4 días   | jue 05/08/21 | mar 10/08/21 | _ 0%  |
| 229        | s/06      | s/06 - Revoque en sobre perfil Omega                 | 4 días   | lun 23/08/21 | jue 26/08/21 | <b>" ■ 0</b> %  |
| 230        | s/07      | s/07 - Revoque en sobre perfil Omega                 | 4 días   | mié 08/09/21 | lun 13/09/21 | ■ 0%  |
| 231        | s/08      | s/08 – Revoque en sobre perfil Omega                 | 4 días   | vie 24/09/21 | mié 29/09/21 | <b>"■ 0</b> %   |
| 232        | s/09      | s/09 – Revoque en sobre perfil Omega                 | 4 días   | mar 12/10/21 | vie 15/10/21 | ■ 0%  |
| 233        | s/10      | s/10 – Revoque en sobre perfil Omega                 | 4 días   | vie 29/10/21 | mié 03/11/21 | <b>□ 0</b> %  |
| 234        | s/11      | s/11 – Revoque en sobre perfil Omega                 | 4 días   | mar 16/11/21 | vie 19/11/21 | ■ 0%  |
| 235        | s/12      | s/12 – Revoque en sobre perfil Omega                 | 4 días   | jue 02/12/21 | mar 07/12/21 | ■ 0%  |
| 236        | s/13      | s/13 – Revoque en sobre perfil Omega                 | 4 días   | lun 20/12/21 | jue 23/12/21 | <b>□ 0</b> %  |
| 237        | s/14      | s/14 – Revoque en sobre perfil Omega                 | 4 días   | jue 06/01/22 | mar 11/01/22 | <b>■ 0</b> %  |
| 238        | s/15      | s/15 – Revoque en sobre perfil Omega                 | 4 días   | mar 25/01/22 | vie 28/01/22 | ■ 0%  |
| 239        | s/16      | s/16 – Revoque en sobre perfil Omega                 | 4 días   | mié 02/02/22 | lun 07/02/22 | ■ 0%  |
| 240        | s/17      | s/17 – Revoque en sobre perfil Omega                 | 4 días   | vie 11/02/22 | mié 16/02/22 | <b>■ 0</b> %  |
| 241        | s/18      | s/18 – Revoque en sobre perfil Omega                 | 4 días   | jue 17/02/22 | mar 22/02/22 | "■ 0%   |
| 242        | s/Terraza | s/Terraza - Revoque en sobre perfil Omega            | 3 días   | lun 14/02/22 | mié 16/02/22 | <b>』</b> 0%   |
| 243        |           | 13-CIELORRASOS Y CAJONES                             | 241 días | mié 23/06/21 | mié 25/05/22 | 0%  |
| 244        | s/0000S.S | s/0000S.S.2 - Laca Transparente                      | 4 días   | mar 19/04/22 | vie 22/04/22 | <b>□</b> 0%   |
| 245        | s/000S.S. | s/000S.S.1 - Laca Transparente                       | 15 días  | lun 25/04/22 | vie 13/05/22 | ■ 0%  |
| 246        | s/00P.B.  | s/00P.B Laca Transparente                            | 4 días   | jue 28/04/22 | mar 03/05/22 | -, 0%   |
| 247        | s/00P.B.  | s/00P.B. – Casetonado Madera                         | 4 días   | jue 28/04/22 | mar 03/05/22 | <b>™</b> 0%   |
| 248        | s/00P.B.  | s/00P.B Suspendido PLACA CIEL                        | 7 días   | jue 14/04/22 | vie 22/04/22 | - 0%  |
| 249        | s/00P.B.  | s/00P.B Suspendido AQUABOARD                         | 10 días  | jue 14/04/22 | mié 27/04/22 | <b>■ 0</b> %  |
| 250        | s/00P.B.  | s/00P.B Suspendido MADERA                            | 6 días   | jue 28/04/22 | jue 05/05/22 | <b>■ 0</b> %  |
| 251        | s/01      | S/01 - Laca Transparente                             | 3 días   | vie 20/05/22 | mar 24/05/22 | <b>□</b> 0%   |
| 252        | s/01      | S/01 - Cielorraso Machimbre                          | 4 días   | vie 20/05/22 | mié 25/05/22 | - 0%  |
| 253        | s/01      | S/01 - Garganta Palier                               | 3 días   | vie 20/05/22 | mar 24/05/22 | - 0%  |
| 254        | s/01      | S/01 - Suspendido PLACA CIEL                         | 20 días  | vie 22/04/22 | jue 19/05/22 | <b>— 0</b> %  |
| 255        | s/01      | S/01 - Suspendido AQUABOARD                          | 3 días   | vie 22/04/22 | mar 26/04/22 | <b>□</b> 0%   |
| 256        | s/01      | S/01 - Suspendido MADERA                             | 4 días   | vie 20/05/22 | mié 25/05/22 | <b>■</b> 0%   |
| 257        | s/02      | s/02 - Laca Transparente                             | 3 días   | mié 21/07/21 | vie 23/07/21 | ı, <b>0</b> %   |
| 258        | s/02      | s/02 – Cielorraso Machimbre                          | 4 días   | mié 21/07/21 | lun 26/07/21 | <b>™</b> 0%   |
| 259        | s/02      | s/02 - Garganta Palier                               | 3 días   | mié 21/07/21 | vie 23/07/21 | ı, 0%   |
|            | s/02      | s/02 - Suspendido PLACA CIEL                         | 20 días  | mié 23/06/21 | mar 20/07/21 | <b>0</b> %  |
| 260        |           | s/02 - Suspendido AQUABOARD                          | 3 días   | mié 23/06/21 | vie 25/06/21 | , <b>0</b> %  |
| 260<br>261 |           |  | / díac   | mié 21/07/21 | lun 26/07/21 | <b>□</b> 0%   |
| 261        | s/02      | s/02 – Suspendido MADERA                             | 4 días   | 2            |              |   |
| 261<br>262 |           | s/02 - Suspendido MADERA<br>s/03 - Laca Transparente | 3 días   | vie 06/08/21 | mar 10/08/21 | ■ 0%  |

|     |        |   | 1        |              | 2021.03.0    |
|-----|--------|---|----------|--------------|--------------|
|     | Texto1 | Nombre de tarea   | Duración | Comienzo     | Fin          |
| 265 | s/03   | s/03 - Garganta Palier                                  | 3 días   | vie 06/08/21 | mar 10/08/21 |
|     | s/03   | s/03 - Suspendido PLACA CIEL                            | 20 días  | vie 09/07/21 | jue 05/08/21 |
|     | s/03   | s/03 - Suspendido AQUABOARD                             | 3 días   | vie 09/07/21 | mar 13/07/21 |
|     | s/03   | s/03 - Suspendido MADERA                                | 4 días   | vie 06/08/21 | mié 11/08/21 |
|     | s/04   | s/04 - Laca Transparente                                | 3 días   | mar 24/08/21 | jue 26/08/21 |
|     | s/04   | s/04 - Cielorraso Machimbre                             | 4 días   | mar 24/08/21 | vie 27/08/21 |
|     | s/04   | s/04 - Cietorraso Macinillore<br>s/04 - Garganta Palier | 3 días   | mar 24/08/21 | jue 26/08/21 |
|     | s/04   | s/04 - Guspendido PLACA CIEL                            | 20 días  | mar 27/07/21 | lun 23/08/21 |
|     |        |   |          |              |              |
|     | s/04   | s/04 - Suspendido AQUABOARD                             | 3 días   | mar 27/07/21 | jue 29/07/21 |
|     | s/04   | s/04 - Suspendido MADERA                                | 4 días   | mar 24/08/21 | vie 27/08/21 |
|     | s/05   | s/05 - Laca Transparente                                | 3 días   | jue 09/09/21 | lun 13/09/21 |
|     | s/05   | s/05 - Cielorraso Machimbre                             | 4 días   | jue 09/09/21 | mar 14/09/21 |
|     | s/05   | s/05 - Garganta Palier                                  | 3 días   | jue 09/09/21 | lun 13/09/21 |
| 278 | s/05   | s/05 – Suspendido PLACA CIEL                            | 20 días  | jue 12/08/21 | mié 08/09/21 |
| 279 | s/05   | s/05 - Suspendido AQUABOARD                             | 3 días   | jue 12/08/21 | lun 16/08/21 |
| 280 | s/05   | s/05 - Suspendido MADERA                                | 4 días   | jue 09/09/21 | mar 14/09/21 |
| 281 | s/06   | s/06 - Laca Transparente                                | 3 días   | lun 27/09/21 | mié 29/09/21 |
| 282 | s/06   | s/06 – Cielorraso Machimbre                             | 4 días   | lun 27/09/21 | jue 30/09/21 |
| 283 | s/06   | s/06 - Garganta Palier                                  | 3 días   | lun 27/09/21 | mié 29/09/21 |
| 284 | s/06   | s/06 - Suspendido PLACA CIEL                            | 20 días  | lun 30/08/21 | vie 24/09/21 |
| 285 | s/06   | s/06 - Suspendido AQUABOARD                             | 3 días   | lun 30/08/21 | mié 01/09/21 |
| 286 | s/06   | s/06 - Suspendido MADERA                                | 4 días   | lun 27/09/21 | jue 30/09/21 |
| 287 | s/07   | s/07 - Laca Transparente                                | 3 días   | mié 13/10/21 | vie 15/10/21 |
| 288 | s/07   | s/07 – Cielorraso Machimbre                             | 4 días   | mié 13/10/21 | lun 18/10/21 |
| 289 | s/07   | s/07 - Garganta Palier                                  | 3 días   | mié 13/10/21 | vie 15/10/21 |
| 290 | s/07   | s/07 - Suspendido PLACA CIEL                            | 20 días  | mié 15/09/21 | mar 12/10/21 |
|     | s/07   | s/07 - Suspendido AQUABOARD                             | 3 días   | mié 15/09/21 | vie 17/09/21 |
|     | s/07   | s/07 – Suspendido MADERA                                | 4 días   | mié 13/10/21 | lun 18/10/21 |
|     | s/08   | s/08 - Laca Transparente                                | 3 días   | vie 29/10/21 | mar 02/11/21 |
|     | s/08   | s/08 - Cielorraso Machimbre                             | 4 días   | vie 29/10/21 | mié 03/11/21 |
|     | s/08   | s/08 - Garganta Palier                                  | 3 días   | vie 29/10/21 | mar 02/11/21 |
|     |        |   |          |              |              |
|     | s/08   | s/08 - Suspendido PLACA CIEL                            | 20 días  | vie 01/10/21 | jue 28/10/21 |
|     | s/08   | s/08 - Suspendido AQUABOARD                             | 3 días   | vie 01/10/21 | mar 05/10/21 |
|     | s/08   | s/08 - Suspendido MADERA                                | 4 días   | vie 29/10/21 | mié 03/11/21 |
|     | s/09   | s/09 – Laca Transparente                                | 3 días   | mar 16/11/21 | jue 18/11/21 |
|     | s/09   | s/09 – Cielorraso Machimbre                             | 4 días   | mar 16/11/21 | vie 19/11/21 |
|     | s/09   | s/09 - Garganta Palier                                  | 3 días   | mar 16/11/21 | jue 18/11/21 |
| 302 | s/09   | s/09 - Suspendido PLACA CIEL                            | 20 días  | mar 19/10/21 | lun 15/11/21 |
| 303 | s/09   | s/09 - Suspendido AQUABOARD                             | 3 días   | mar 19/10/21 | jue 21/10/21 |
| 304 | s/09   | s/09 - Suspendido MADERA                                | 4 días   | mar 16/11/21 | vie 19/11/21 |
| 305 | s/10   | S/10 - Laca Transparente                                | 3 días   | vie 03/12/21 | mar 07/12/21 |
| 306 | s/10   | S/10 – Cielorraso Machimbre                             | 4 días   | vie 03/12/21 | mié 08/12/21 |
| 307 | s/10   | S/10 - Garganta Palier                                  | 3 días   | vie 03/12/21 | mar 07/12/21 |
| 200 | s/10   | S/10 - Suspendido PLACA CIEL                            | 20 días  | vie 05/11/21 | jue 02/12/21 |

|     |       |                              |          |              | 2021.03.0    |
|-----|-------|------------------------------|----------|--------------|--------------|
| i   | Texto | Nombre de tarea              | Duración | Comienzo     | Fin          |
| 309 | s/10  | S/10 - Suspendido AQUABOARD  | 3 días   | vie 05/11/21 | mar 09/11/21 |
|     | s/10  | S/10 - Suspendido MADERA     | 4 días   | vie 03/11/21 | mié 08/12/21 |
|     |       | S/11 - Laca Transparente     | 3 días   | mar 21/12/21 | jue 23/12/21 |
|     |       |                              |          |              |              |
|     | s/11  | S/11 - Cielorraso Machimbre  | 4 días   | mar 21/12/21 | vie 24/12/21 |
|     | s/11  | S/11 - Garganta Palier       | 3 días   | mar 21/12/21 | jue 23/12/21 |
|     | s/11  | S/11 - Suspendido PLACA CIEL | 20 días  | mar 23/11/21 | lun 20/12/21 |
|     | s/11  | S/11 - Suspendido AQUABOARD  | 3 días   | mar 23/11/21 | jue 25/11/21 |
|     | s/11  | S/11 - Suspendido MADERA     | 4 días   | mar 21/12/21 | vie 24/12/21 |
| 317 | s/12  | S/12 - Laca Transparente     | 3 días   | jue 06/01/22 | lun 10/01/22 |
| 318 | s/12  | S/12 – Cielorraso Machimbre  | 4 días   | jue 06/01/22 | mar 11/01/22 |
| 319 | s/12  | S/12 - Garganta Palier       | 3 días   | jue 06/01/22 | lun 10/01/22 |
| 320 | s/12  | S/12 - Suspendido PLACA CIEL | 20 días  | jue 09/12/21 | mié 05/01/22 |
| 321 | s/12  | S/12 - Suspendido AQUABOARD  | 3 días   | jue 09/12/21 | lun 13/12/21 |
| 322 | s/12  | S/12 - Suspendido MADERA     | 4 días   | jue 06/01/22 | mar 11/01/22 |
| 323 | s/13  | S/13 - Laca Transparente     | 3 días   | lun 24/01/22 | mié 26/01/22 |
| 324 | s/13  | S/13 – Cielorraso Machimbre  | 4 días   | lun 24/01/22 | jue 27/01/22 |
|     |       | S/13 - Garganta Palier       | 3 días   | lun 24/01/22 | mié 26/01/22 |
|     | s/13  | S/13 - Suspendido PLACA CIEL | 20 días  | lun 27/12/21 | vie 21/01/22 |
|     |       | S/13 - Suspendido AQUABOARD  | 3 días   | lun 27/12/21 | mié 29/12/21 |
|     | s/13  | S/13 – Suspendido MADERA     | 4 días   | lun 24/01/22 | jue 27/01/22 |
|     | s/14  | S/14 - Laca Transparente     | 3 días   | jue 10/02/22 | lun 14/02/22 |
|     |       | ·                            |          |              |              |
|     | s/14  | S/14 - Cielorraso Machimbre  | 4 días   | jue 10/02/22 | mar 15/02/22 |
|     | _     | S/14 - Garganta Palier       | 3 días   | jue 10/02/22 | lun 14/02/22 |
|     | s/14  | S/14 - Suspendido PLACA CIEL | 20 días  | jue 13/01/22 | mié 09/02/22 |
|     | s/14  | S/14 – Suspendido AQUABOARD  | 3 días   | jue 13/01/22 | lun 17/01/22 |
| 334 | s/14  | S/14 – Suspendido MADERA     | 4 días   | jue 10/02/22 | mar 15/02/22 |
| 335 | s/15  | S/15 - Laca Transparente     | 3 días   | mar 01/03/22 | jue 03/03/22 |
| 336 | s/15  | S/15 – Cielorraso Machimbre  | 4 días   | mar 01/03/22 | vie 04/03/22 |
| 337 | s/15  | S/15 - Garganta Palier       | 3 días   | mar 01/03/22 | jue 03/03/22 |
| 338 | s/15  | S/15 – Suspendido PLACA CIEL | 20 días  | mar 01/02/22 | lun 28/02/22 |
| 339 | s/15  | S/15 - Suspendido AQUABOARD  | 3 días   | mar 01/02/22 | jue 03/02/22 |
| 340 | s/15  | S/15 - Suspendido MADERA     | 4 días   | mar 01/03/22 | vie 04/03/22 |
|     | s/16  | S/16 - Laca Transparente     | 3 días   | mié 09/03/22 | vie 11/03/22 |
|     | s/16  | S/16 – Cielorraso Machimbre  | 4 días   | mié 09/03/22 | lun 14/03/22 |
|     | s/16  | S/16 - Garganta Palier       | 3 días   | mié 09/03/22 | vie 11/03/22 |
|     | s/16  | S/16 - Suspendido PLACA CIEL | 20 días  | mié 09/02/22 | mar 08/03/22 |
|     | s/16  | S/16 - Suspendido AQUABOARD  | 3 días   | mié 09/02/22 | vie 11/02/22 |
|     | s/16  | S/16 - Suspendido MADERA     | 4 días   | mié 09/03/22 | lun 14/03/22 |
|     |       |                              |          |              |              |
|     | s/17  | S/17 - Laca Transparente     | 3 días   | vie 18/03/22 | mar 22/03/22 |
|     | s/17  | S/17 – Cielorraso Machimbre  | 4 días   | vie 18/03/22 | mié 23/03/22 |
|     | s/17  | S/17 - Garganta Palier       | 3 días   | vie 18/03/22 | mar 22/03/22 |
|     | s/17  | S/17 - Suspendido PLACA CIEL | 20 días  | vie 18/02/22 | jue 17/03/22 |
| 351 | s/17  | S/17 - Suspendido AQUABOARD  | 3 días   | vie 18/02/22 | mar 22/02/22 |
| 352 | s/17  | S/17 – Suspendido MADERA     | 4 días   | vie 18/03/22 | mié 23/03/22 |


|     |           |   |          |              | 2021.03.04   | -Cronograma de trabajos ZOE-  |
|-----|-----------|---|----------|--------------|--------------|---|
| [d  | Texto1    | Nombre de tarea                               | Duración | Comienzo     | Fin          | 0   Semestre 1, 2021   Semestre 2, 2021   Semestre 1, 2022   Semestre 2, 2022   Semestre 1, 2023   Semestre 2, 2023   Semestre 2, 2023   Semestre 1, 2023   Semestre 2, 2023   Semestre 1, 2023   Semestre 2, 2024   Semestre 2, 2025   Semestre 2, 2025   Semestre 2, 2026   Semestre 3, 2026   Semestre 2, 2026   Semestre 3, 2027   Semestre 3, 2027   Semestre 3, 2028   Semestre |
| 353 | s/18      | S/18 - Laca Transparente                      | 3 días   | jue 24/03/22 | lun 28/03/22 | <b>□ 0</b> %  |
| 354 | s/18      | S/18 – Cielorraso Machimbre                   | 4 días   | jue 24/03/22 | mar 29/03/22 | ■ 0%  |
| 355 | s/18      | S/18 - Garganta Palier                        | 3 días   | jue 24/03/22 | lun 28/03/22 | <b>□</b> 0%   |
| 356 | s/18      | S/18 - Suspendido PLACA CIEL                  | 20 días  | jue 24/02/22 | mié 23/03/22 | <b>— 0</b> %  |
| 357 | s/18      | S/18 - Suspendido AQUABOARD                   | 3 días   | jue 24/02/22 | lun 28/02/22 | <b>□</b> 0%   |
| 358 | s/Terraza | s/Terraza - Laca Transparente                 | 3 días   | vie 04/02/22 | mar 08/02/22 | ■ 0%  |
| 359 | s/Terraza | s/Terraza - Suspendido PLACA CIEL             | 3 días   | vie 04/02/22 | mar 08/02/22 | <b>□</b> 0%   |
| 360 |           | 14-CONTRAPISOS Y CARPETAS                     | 219 días | vie 28/05/21 | mié 30/03/22 | 0%  |
| 361 | s/0000S.S | s/0000S.S.2 - Contrapiso con Malla sobre losa | 2 días   | vie 18/02/22 | lun 21/02/22 | ", 0%   |
| 362 | s/000S.S. | s/000S.S.1 - Contrapiso con Malla sobre losa  | 2 días   | mié 02/03/22 | jue 03/03/22 | ı, <b>0</b> %   |
| 363 | s/00P.B.  | s/00P.B Contrapiso con Malla sobre losa       | 2 días   | vie 25/03/22 | lun 28/03/22 | □ <sub>1</sub> 0%   |
| 364 | s/00P.B.  | s/00P.B Contrapiso Bombeado                   | 2 días   | mié 23/03/22 | jue 24/03/22 | ı, <b>0</b> %   |
| 365 | s/01      | S/01 - Contrapiso Bombeado                    | 2 días   | mar 29/03/22 | mié 30/03/22 | ı, 0%   |
| 366 | s/02      | S/02 - Contrapiso Bombeado                    | 2 días   | vie 28/05/21 | lun 31/05/21 | <b>□, 0%</b>  |
| 367 | s/03      | S/03 - Contrapiso Bombeado                    | 2 días   | mar 15/06/21 | mié 16/06/21 | ı, <b>0</b> %   |
| 368 | s/04      | S/04 - Contrapiso Bombeado                    | 2 días   | jue 01/07/21 | vie 02/07/21 | ı, <b>0</b> %   |
| 369 | s/05      | S/05 - Contrapiso Bombeado                    | 2 días   | lun 19/07/21 | mar 20/07/21 | ı <sub>1</sub> 0%   |
| 370 | s/06      | S/06 - Contrapiso Bombeado                    | 2 días   | mié 04/08/21 | jue 05/08/21 | ı, <b>0</b> %   |
| 371 | s/07      | S/07 - Contrapiso Bombeado                    | 2 días   | vie 20/08/21 | lun 23/08/21 | <b>□</b> , 0%   |
| 372 | s/08      | S/08 - Contrapiso Bombeado                    | 2 días   | mar 07/09/21 | mié 08/09/21 | ı, <b>0</b> %   |
| 373 | s/09      | S/09 - Contrapiso Bombeado                    | 2 días   | jue 23/09/21 | vie 24/09/21 | ı <sub>,</sub> 0%   |
| 374 | s/10      | S/10 - Contrapiso Bombeado                    | 2 días   | mar 12/10/21 | mié 13/10/21 | 1,0%  |
| 375 | s/11      | S/11 - Contrapiso Bombeado                    | 2 días   | jue 28/10/21 | vie 29/10/21 | ı, <b>0</b> %   |
| 376 | s/12      | S/12 – Contrapiso Bombeado                    | 2 días   | lun 15/11/21 | mar 16/11/21 | ı <sub>1</sub> 0%   |
|     | s/13      | S/13 - Contrapiso Bombeado                    | 2 días   | mié 01/12/21 | jue 02/12/21 | 0%  |
|     | s/14      | S/14 - Contrapiso Bombeado                    | 2 días   | lun 20/12/21 | mar 21/12/21 | ₁ <b>, 0</b> %  |
|     | s/15      | S/15 - Contrapiso Bombeado                    | 2 días   | jue 06/01/22 | vie 07/01/22 | 0%  |
|     | s/16      | S/16 - Contrapiso Bombeado                    | 2 días   | vie 14/01/22 | lun 17/01/22 | ", 0%   |
|     | s/17      | S/17 – Contrapiso Bombeado                    | 2 días   | mar 25/01/22 | mié 26/01/22 | . 0%  |
|     | s/18      | S/18 - Contrapiso Bombeado                    | 2 días   | mar 01/02/22 | mié 02/02/22 | . 0%  |
| 383 |           | s/Terraza - Contrapiso Bombeado               | 2 días   | vie 04/02/22 | lun 07/02/22 | ", 0%   |
| 384 |           | 15-PISOS Y ZOCALOS                            | 222 días | mié 21/07/21 | jue 26/05/22 | 0%  |
|     | s/0000S.S |   | 4 días   | mié 13/04/22 | lun 18/04/22 | . 0%  |
|     | s/000S.S. |   | 4 días   | mar 19/04/22 | vie 22/04/22 | 0%  |
| 387 |           | s/00P.B Hormigon Helicoptero                  | 4 días   | lun 25/04/22 | jue 28/04/22 | ■ 0%  |
|     | s/00P.B.  | s/00P.B Porcellanato                          | 4 días   | vie 29/04/22 | mié 04/05/22 | 0%  |
|     | s/01      | S/01 - Porcellanato                           | 5 días   | vie 20/05/22 | jue 26/05/22 | ■ 0%  |
|     | s/02      | S/02 - Porcellanato                           | 5 días   | mié 21/07/21 | mar 27/07/21 | ■ 0%  |
|     |           | S/03 - Porcellanato                           | 5 días   | vie 06/08/21 | jue 12/08/21 | ■ 0%  |
|     | s/04      | S/04 - Porcellanato                           | 5 días   | mar 24/08/21 | lun 30/08/21 | 0%  |
|     | s/05      | S/05 - Porcellanato                           | 5 días   | jue 09/09/21 | mié 15/09/21 | 0%  |
|     | s/06      | S/06 - Porcellanato                           | 5 días   | lun 27/09/21 | vie 01/10/21 | ■ 0%  |
|     | s/07      | S/07 - Porcellanato                           | 5 días   | mié 13/10/21 | mar 19/10/21 | ■ 0%  |
|     |           |   |          |              |              |   |
| 396 | s/08      | S/08 - Porcellanato                           | 5 días   | vie 29/10/21 | jue 04/11/21 | <b>□ 0</b> %  |

| -I  | To be 1. No orbital and a            | <b>5</b> ·/ | C            |                              | 4 -Cronograma de trabajos ZOE- |
|-----|--------------------------------------|-------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| d   | Texto1 Nombre de tarea               | Duración    | Comienzo     | Fin                          | 0                              |
| 397 | s/09 S/09 - Porcellanato             | 5 días      | mar 16/11/21 | lun 22/11/21                 | ■ 0%                           |
| 398 | s/10 S/10 - Porcellanato             | 5 días      | vie 03/12/21 | jue 09/12/21                 | <b>□</b> 0%                    |
| 399 | s/11 S/11 - Porcellanato             | 5 días      | mar 21/12/21 | lun 27/12/21                 | <b>□</b> 0%                    |
| 400 | s/12 S/12 - Porcellanato             | 5 días      | jue 06/01/22 | mié 12/01/22                 | ■ 0%                           |
| 401 | s/13 S/13 - Porcellanato             | 5 días      | lun 24/01/22 | vie 28/01/22                 | <b>□</b> 0%                    |
| 402 | s/14 S/14 - Porcellanato             | 5 días      | jue 10/02/22 | mié 16/02/22                 | ■ 0%                           |
| 403 | s/15 S/15 - Porcellanato             | 5 días      | mar 01/03/22 | lun 07/03/22                 | ■ 0%                           |
| 404 | s/16 S/16 - Porcellanato             | 5 días      | lun 14/03/22 | vie 18/03/22                 | <b>™</b> 0%                    |
| 405 | s/17 S/17 - Porcellanato             | 5 días      | jue 24/03/22 | mié 30/03/22                 | ■ 0%                           |
| 406 | s/18 S/18 - Porcellanato             | 5 días      | mié 06/04/22 | mar 12/04/22                 | <b>■ 0</b> %                   |
| 407 | s/Terraza - Porcellanato             | 5 días      | mar 19/04/22 | lun 25/04/22                 | <b>□ 0</b> %                   |
| 408 | 16-REVESTIMIENTOS                    | 221 días    | mié 28/07/21 | mié 01/06/22                 | 0%                             |
|     | s/00P.B. s/00P.B Revestiminetos      | 4 días      | jue 05/05/22 | mar 10/05/22                 | 0%                             |
|     | s/01 S/01 - Revestiminetos           | 4 días      | vie 27/05/22 | mié 01/06/22                 | - 0%                           |
|     | s/02 S/02 - Revestiminetos           | 4 días      | mié 28/07/21 | lun 02/08/21                 | - 0%                           |
|     | s/03 S/03 - Revestiminetos           | 4 días      | vie 13/08/21 | mié 18/08/21                 | - 0%                           |
|     | s/04 S/04 - Revestiminetos           | 4 días      | mar 31/08/21 | vie 03/09/21                 | ■ 0%                           |
|     | s/05 S/05 - Revestiminetos           | 4 días      | jue 16/09/21 | mar 21/09/21                 | - 0%                           |
|     | s/06 S/06 - Revestiminetos           | 4 días      | lun 04/10/21 | jue 07/10/21                 | _ 0%                           |
|     | s/07 S/07 - Revestiminetos           | 4 días      | mié 20/10/21 | lun 25/10/21                 | <b>0</b> %                     |
|     | s/08 S/08 - Revestiminetos           | 4 días      | vie 05/11/21 | mié 10/11/21                 | ■ 0%                           |
|     | s/09 S/09 - Revestiminetos           | 4 días      | mar 23/11/21 | vie 26/11/21                 | ■ 0%                           |
|     | s/10 S/10 - Revestiminetos           | 4 días      | vie 10/12/21 | mié 15/12/21                 | ■ 0%                           |
|     | s/11 S/11 - Revestiminetos           | 4 días      | mar 28/12/21 | vie 31/12/21                 | 0%                             |
|     | s/12 S/12 - Revestiminetos           | 4 días      | jue 13/01/22 | mar 18/01/22                 | • 0%                           |
|     | s/13 S/13 - Revestiminetos           | 4 días      | lun 31/01/22 | jue 03/02/22                 | ■ 0%                           |
|     | s/14 S/14 - Revestiminetos           | 4 días      | jue 17/02/22 | mar 22/02/22                 | ■ 0%                           |
|     | s/15 S/15 - Revestiminetos           |             | mar 08/03/22 |                              | 0%                             |
|     |                                      | 4 días      | lun 21/03/22 | vie 11/03/22<br>mié 23/03/22 | 0%                             |
|     | s/16 S/16 - Revestiminetos           | 3 días      |              |                              | ■ 0%                           |
|     | s/17 S/17 - Revestiminetos           | 4 días      | jue 31/03/22 | mar 05/04/22                 | 0%                             |
|     | s/18 S/18 - Revestiminetos           | 4 días      | mié 13/04/22 | lun 18/04/22                 | 0%                             |
|     | s/Terraza s/Terraza - Revestiminetos | 4 días      | mar 26/04/22 | vie 29/04/22                 |                                |
| 429 | 17-CONDUCTOS Y REJILLAS              | 34 días     | vie 15/04/22 | mié 01/06/22                 | 0%                             |
| 430 | CONDUCTO SIMPLE RH                   | 20 días     | vie 15/04/22 | jue 12/05/22                 | — 0%<br>— 0%                   |
| 431 | COLOCACION DE REJILLAS EN BALCONES   | 10 días     | jue 05/05/22 | mié 18/05/22                 |                                |
| 432 | COLOCACION DE REJILLAS EN BAÑOS      | 10 días     | jue 19/05/22 | mié 01/06/22                 | - 0%                           |
| 433 | 18-MARMOLERIA                        | 226 días    | mié 07/07/21 | mié 18/05/22                 | 0%                             |
| 434 |                                      | 7 días      | mié 26/01/22 | jue 03/02/22                 | <b>0%</b>                      |
|     | s/OOP.B. s/OOP.B. – Marmoleria       | 5 días      | jue 28/04/22 | mié 04/05/22                 | <b>■ 0%</b>                    |
|     | s/01 S/01 - Marmoleria               | 5 días      | jue 12/05/22 | mié 18/05/22                 | ■ 0%                           |
|     | s/02 S/02 - Marmoleria               | 4 días      | mié 07/07/21 | lun 12/07/21                 | <b>", 0%</b>                   |
| 438 | s/03 S/03 - Marmoleria               | 4 días      | vie 23/07/21 | mié 28/07/21                 | <b>0</b> %                     |
| 439 | s/04 S/04 - Marmoleria               | 4 días      | mar 10/08/21 | vie 13/08/21                 | □ 0%                           |
| 440 | s/05 S/05 - Marmoleria               | 4 días      | jue 26/08/21 | mar 31/08/21                 | <b>□</b> 0%                    |


| d   | Texto1    | Nombre de tarea                            | Duración                  | Comienzo                     | Fin                          | 0   Semestre 1, 2021   Semestre 2, 2021   Semestre 1, 2022   Semestre 2, 2022   Semestre 1, 2023   Semestre 2, 2023   Semestre 2 |
|-----|-----------|--|---------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| 111 | s/06      | S/06 - Marmoleria                          | 4 días                    | lun 13/09/21                 | jue 16/09/21                 | N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M  |
|     | s/07      | S/07 - Marmoleria                          | 4 días                    | mié 29/09/21                 | lun 04/10/21                 | ■ 0%   |
|     | s/08      | S/08 - Marmoleria                          | 4 días                    | vie 15/10/21                 | mié 20/10/21                 | ■ 0%   |
|     | s/09      | S/09 - Marmoleria                          | 4 días                    | mar 02/11/21                 | vie 05/11/21                 | 0%   |
|     | s/10      | S/10 - Marmoleria                          | 4 días                    | vie 19/11/21                 | mié 24/11/21                 | ■ 0%   |
|     | s/11      | S/11 - Marmoleria                          | 4 días                    | mar 07/12/21                 | vie 10/12/21                 | 0%   |
|     | s/12      | S/12 - Marmoteria                          | 4 días                    | jue 23/12/21                 | mar 28/12/21                 | 0%   |
|     | s/13      | S/13 - Marmoleria                          | 4 días                    | lun 10/01/22                 | jue 13/01/22                 | <b>□ 0</b> %   |
|     | s/14      | S/14 - Marmoleria                          | 4 días                    | jue 27/01/22                 | mar 01/02/22                 | ■ 0%   |
|     | s/15      | S/15 - Marmoleria                          | 4 días                    | mar 15/02/22                 | vie 18/02/22                 | 0%   |
|     | s/16      | S/16 - Marmoleria                          | 3 días                    | mar 01/03/22                 | jue 03/03/22                 | , 0%   |
|     |           | S/17 - Marmoleria                          | 4 días                    | mar 15/03/22                 | vie 18/03/22                 | • 0%   |
|     | s/17      | S/18 - Marmoleria                          | 4 días                    | mar 15/03/22<br>mar 29/03/22 | vie 01/04/22                 | ■ 0%   |
|     | s/18      | s/Terraza - Marmoleria                     |                           |                              |                              | □ 0%<br>□ 0%   |
|     | s/Terraza | s/lerraza - Marmoteria  19-AYUDA DE GREMIO | 4 días<br><b>395 días</b> | mar 12/04/22<br>mié 03/02/21 | vie 15/04/22<br>mar 09/08/22 | 6%   |
| 455 |           |  |                           |                              |                              | 6%   |
| 456 |           | AYUDA DE GREMIO DE OBRA                    | 380 días                  | mié 03/02/21                 | mar 19/07/22                 | — 0%   |
| 457 |           | Limpieza Final de Obra                     | 15 días                   | mié 20/07/22                 | mar 09/08/22                 |  |
| 458 |           | 20-SERVICIOS VARIOS                        | 380 días                  | mié 03/02/21                 | mar 19/07/22                 | 6%   |
| 459 |           | SERVICIOS VARIOS DE OBRA                   | 380 días                  | mié 03/02/21                 | mar 19/07/22                 | 6%   |
| 460 | (222.5    | 21-CARPINTERIA DE MADERA                   | 255 días                  | mar 08/06/21                 | lun 30/05/22                 | 0%   |
|     | s/00P.B.  | s/00P.B Marcos                             | 2 días                    | jue 31/03/22                 | vie 01/04/22                 | ı, 0%  |
|     | s/00P.B.  | s/00P.B. – Montaje Carpinteria             | 2 días                    | jue 05/05/22                 | vie 06/05/22                 | ı, 0%  |
|     | s/01      | S/01 - Marcos                              | 2 días                    | jue 07/04/22                 | vie 08/04/22                 | 1,0%   |
|     | s/01      | S/01 - Montaje Carpinteria                 | 2 días                    | vie 27/05/22                 | lun 30/05/22                 | ı, 0%  |
|     | s/02      | S/02 - Marcos                              | 2 días                    | mar 08/06/21                 | mié 09/06/21                 | 1, <b>0</b> %  |
|     | s/02      | S/02 - Montaje Carpinteria                 | 2 días                    | mié 28/07/21                 |                              | ı, 0%  |
|     | s/03      | S/03 - Marcos                              | 2 días                    | jue 24/06/21                 | vie 25/06/21                 | ı, 0%  |
|     | s/03      | S/03 - Montaje Carpinteria                 | 2 días                    | vie 13/08/21                 | lun 16/08/21                 | ", <b>0</b> %  |
| 469 | s/04      | S/04 - Marcos                              | 2 días                    | lun 12/07/21                 | mar 13/07/21                 | <b>1</b> 0%  |
| 470 | s/04      | S/04 - Montaje Carpinteria                 | 2 días                    | mar 31/08/21                 | mié 01/09/21                 | ı, <b>0</b> %  |
| 471 | s/05      | S/05 - Marcos                              | 2 días                    | mié 28/07/21                 | jue 29/07/21                 | ı, <b>0</b> %  |
| 472 | s/05      | S/05 - Montaje Carpinteria                 | 2 días                    | jue 16/09/21                 | vie 17/09/21                 | ı, <b>0</b> %  |
| 473 | s/06      | S/06 - Marcos                              | 2 días                    | vie 13/08/21                 | lun 16/08/21                 | <b>□, 0%</b>   |
| 474 | s/06      | S/06 - Montaje Carpinteria                 | 2 días                    | lun 04/10/21                 | mar 05/10/21                 | ı <sub>n</sub> 0%  |
| 475 | s/07      | S/07 - Marcos                              | 2 días                    | mar 31/08/21                 | mié 01/09/21                 | ı, <b>0</b> %  |
| 476 | s/07      | S/07 - Montaje Carpinteria                 | 2 días                    | mié 20/10/21                 | jue 21/10/21                 | ı, <b>0</b> %  |
| 477 | s/08      | S/08 - Marcos                              | 2 días                    | jue 16/09/21                 | vie 17/09/21                 | ı, <b>0</b> %  |
| 478 | s/08      | S/08 - Montaje Carpinteria                 | 2 días                    | vie 05/11/21                 | lun 08/11/21                 | <b>□, 0%</b>   |
| 479 | s/09      | S/09 – Marcos                              | 2 días                    | lun 04/10/21                 | mar 05/10/21                 | <b>□ 0%</b>  |
| 480 | s/09      | S/09 - Montaje Carpinteria                 | 2 días                    | mar 23/11/21                 | mié 24/11/21                 | ı, 0%  |
| 481 | s/10      | S/10 - Marcos                              | 2 días                    | jue 21/10/21                 | vie 22/10/21                 | ı, 0%  |
| 482 | s/10      | S/10 - Montaje Carpinteria                 | 2 días                    | vie 10/12/21                 | lun 13/12/21                 | ", <b>0</b> %  |
| 483 | s/11      | S/11 - Marcos                              | 2 días                    | lun 08/11/21                 | mar 09/11/21                 | ₁ <sub>□</sub> 0%  |
| 484 | s/11      | S/11 - Montaje Carpinteria                 | 2 días                    | mar 28/12/21                 | mié 29/12/21                 | ı, <b>0</b> %  |

| T -I | т        | No object de terre                                | D ''     | C            |              | -Cronograma de trabajos ZOE-  |
|------|----------|---|----------|--------------|--------------|---|
| Id   |          | Nombre de tarea                                   | Duración | Comienzo     | Fin          | 0   Semestre 1, 2021   Semestre 2, 2021   Semestre 1, 2022   Semestre 2, 2022   Semestre 1, 2023   Semestre 2, 2023   Semestre 1, 2023   Semestre 2, 2023   Semestre 1, 2023   Semestre 2, 2024   Semestre 2, 2025   Semestre 2, 2026   Semestre 2, 2026   Semestre 2, 2027   Semestre 2, 2027   Semestre 2, 2028   Semestre |
|      | s/12     | S/12 - Marcos                                     | 2 días   | mié 24/11/21 | jue 25/11/21 | ı,0%  |
|      | s/12     | S/12 - Montaje Carpinteria                        | 2 días   | jue 13/01/22 | vie 14/01/22 | ı, <b>0</b> %   |
| 487  |          | S/13 - Marcos                                     | 2 días   | vie 10/12/21 | lun 13/12/21 | ", <b>0</b> %   |
|      | s/13     | S/13 - Montaje Carpinteria                        | 2 días   | lun 31/01/22 | mar 01/02/22 | ₁ <sub>1</sub> 0%   |
|      | s/14     | S/14 - Marcos                                     | 2 días   | mié 29/12/21 | jue 30/12/21 | ı, 0%   |
|      | s/14     | S/14 - Montaje Carpinteria                        | 2 días   | jue 17/02/22 | vie 18/02/22 | 1,0%  |
|      | s/15     | S/15 - Marcos                                     | 2 días   | lun 17/01/22 | mar 18/01/22 | ı <sub>n</sub> 0%   |
|      | s/15     | S/15 - Montaje Carpinteria                        | 2 días   | mar 08/03/22 | mié 09/03/22 | ı, <b>0</b> %   |
|      | s/16     | S/16 - Marcos                                     | 2 días   | mar 25/01/22 | mié 26/01/22 | 1, 0%   |
|      | s/16     | S/16 - Montaje Carpinteria                        | 2 días   | lun 21/03/22 | mar 22/03/22 | ₁ <sub>1</sub> 0%   |
|      | s/17     | S/17 - Marcos                                     | 2 días   | jue 03/02/22 | vie 04/02/22 | ı, <b>0</b> %   |
|      | s/17     | S/17 - Montaje Carpinteria                        | 2 días   | jue 31/03/22 | vie 01/04/22 | ı, <b>0</b> %   |
|      |          | S/18 - Marcos                                     | 2 días   | mié 09/02/22 | jue 10/02/22 | 1, 0%   |
|      | s/18     | S/18 - Montaje Carpinteria                        | 2 días   | mié 13/04/22 | jue 14/04/22 | ı, 0%   |
| 499  |          | 22-CARPINTERIA DE ALUMINIO Y ELEMENTOS DE FACHADA | 260 días | mar 01/06/21 | lun 30/05/22 | 0%  |
| 500  | s/00P.B. | s/00P.B. – Marcos                                 | 3 días   | vie 25/03/22 | mar 29/03/22 | ■ 0%  |
| 501  | s/00P.B. | s/00P.B Montaje Carpinteria                       | 2 días   | jue 05/05/22 | vie 06/05/22 | ı, 0%   |
| 502  | s/01     | S/01 - Marcos                                     | 3 días   | jue 31/03/22 | lun 04/04/22 | <b>□</b> 0%   |
| 503  | s/01     | S/01 – Montaje Carpinteria                        | 2 días   | vie 27/05/22 | lun 30/05/22 | ı, 0%   |
| 504  | s/02     | S/02 - Marcos                                     | 3 días   | mar 01/06/21 | jue 03/06/21 | ı, 0%   |
| 505  | s/02     | S/02 - Montaje Carpinteria                        | 2 días   | mié 28/07/21 | jue 29/07/21 | ı, <b>0</b> %   |
| 506  | s/03     | S/03 - Marcos                                     | 3 días   | jue 17/06/21 | lun 21/06/21 | <b>□</b> 0%   |
| 507  | s/03     | S/03 - Montaje Carpinteria                        | 2 días   | vie 13/08/21 | lun 16/08/21 | <b>□,</b> 0%  |
| 508  | s/04     | S/04 - Marcos                                     | 3 días   | lun 05/07/21 | mié 07/07/21 | <b>□</b> 0%   |
| 509  | s/04     | S/04 - Montaje Carpinteria                        | 2 días   | mar 31/08/21 | mié 01/09/21 | ı, <b>0</b> %   |
| 510  | s/05     | S/05 - Marcos                                     | 3 días   | mié 21/07/21 | vie 23/07/21 | ı, <b>0</b> %   |
| 511  | s/05     | S/05 - Montaje Carpinteria                        | 2 días   | jue 16/09/21 | vie 17/09/21 | ı, <b>0</b> %   |
| 512  | S/06     | S/06 - Marcos                                     | 3 días   | vie 06/08/21 | mar 10/08/21 | ■ 0%  |
| 513  | s/06     | S/06 – Montaje Carpinteria                        | 2 días   | lun 04/10/21 | mar 05/10/21 | ' <sub>"</sub> 0%   |
| 514  | s/07     | S/07 - Marcos                                     | 3 días   | mar 24/08/21 | jue 26/08/21 | ı, <b>0</b> %   |
| 515  | s/07     | S/07 – Montaje Carpinteria                        | 2 días   | mié 20/10/21 | jue 21/10/21 | ı, <b>0</b> %   |
| 516  | s/08     | S/08 - Marcos                                     | 3 días   | jue 09/09/21 | lun 13/09/21 | <b>□</b> 0%   |
| 517  | s/08     | S/08 – Montaje Carpinteria                        | 2 días   | vie 05/11/21 | lun 08/11/21 | <b>□, 0%</b>  |
| 518  | s/09     | S/09 - Marcos                                     | 3 días   | lun 27/09/21 | mié 29/09/21 | <b>□</b> 0%   |
| 519  | s/09     | S/09 – Montaje Carpinteria                        | 2 días   | mar 23/11/21 | mié 24/11/21 | ı, <b>0</b> %   |
| 520  | s/10     | S/10 - Marcos                                     | 3 días   | jue 14/10/21 | lun 18/10/21 | □ 0%  |
| 521  | s/10     | S/10 - Montaje Carpinteria                        | 2 días   | vie 10/12/21 | lun 13/12/21 | <b>□, 0%</b>  |
| 522  | s/11     | S/11 - Marcos                                     | 3 días   | lun 01/11/21 | mié 03/11/21 | <b>□</b> 0%   |
| 523  | s/11     | S/11 - Montaje Carpinteria                        | 2 días   | mar 28/12/21 | mié 29/12/21 | ı, <b>0</b> %   |
| 524  | s/12     | S/12 - Marcos                                     | 3 días   | mié 17/11/21 | vie 19/11/21 | □ 0%  |
| 525  | s/12     | S/12 - Montaje Carpinteria                        | 2 días   | jue 13/01/22 | vie 14/01/22 | ı, <b>0</b> %   |
| 526  | s/13     | S/13 - Marcos                                     | 3 días   | vie 03/12/21 | mar 07/12/21 | -, 0%   |
| 527  | s/13     | S/13 - Montaje Carpinteria                        | 2 días   | lun 31/01/22 | mar 01/02/22 | ı <sub>n</sub> 0%   |
| 528  | s/14     | S/14 - Marcos                                     | 3 días   | mié 22/12/21 | vie 24/12/21 | <b>□ 0%</b>   |

| d   | Texto1    | Nombre de tarea   | Duración | Comienzo     | Fin          | 0   Semestre 1, 2021   Semestre 2, 2021   Semestre 1, 2022   Semestre 2, 2022   Semestre 1, 2023   Semestre 2, 2023   Semestre | emestre |
|-----|-----------|---|----------|--------------|--------------|---|---------|
|     |           |   |          |              |              | N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N   | 1 1     |
| 529 |           | 1   | 2 días   | jue 17/02/22 | vie 18/02/22 | 1,0%  |         |
| 530 |           |   | 3 días   | lun 10/01/22 | mié 12/01/22 | <b>□ 0%</b>   |         |
| 531 |           | , ,   | 2 días   | mar 08/03/22 | mié 09/03/22 | 1,0%  |         |
| 532 |           |   | 3 días   | mar 18/01/22 | jue 20/01/22 | ı, 0%   |         |
| 533 |           | S/16 - Montaje Carpinteria  | 2 días   | lun 21/03/22 | mar 22/03/22 | տ 0%  |         |
| 534 | s/17      |   | 3 días   | jue 27/01/22 | lun 31/01/22 | ■ 0%  |         |
| 535 | s/17      | S/17 - Montaje Carpinteria  | 2 días   | jue 31/03/22 | vie 01/04/22 | լ, 0%   |         |
| 536 | s/18      | S/18 - Marcos   | 3 días   | jue 03/02/22 | lun 07/02/22 | <b>□ 0</b> %  |         |
| 537 | s/18      | S/18 - Montaje Carpinteria  | 2 días   | mié 13/04/22 | jue 14/04/22 | ı, <b>0</b> %   |         |
| 538 |           | 23-BLINDEX Y ESPEJOS  | 35 días  | lun 02/05/22 | vie 17/06/22 | <b>□</b> 0%   |         |
| 539 | s/00P.B.  | s/00P.B PAÑO FIJO DE VIDRIO TEMPLADO (BLINDEX)                    | 5 días   | lun 13/06/22 | vie 17/06/22 | <b>■ 0</b> %  |         |
| 540 |           | ESPEJO DE BAÑO  | 10 días  | lun 02/05/22 | vie 13/05/22 | <b>– 0</b> %  |         |
| 541 |           | VIDRIO EN NICHO DE HIDRANTE                                       | 10 días  | lun 02/05/22 | vie 13/05/22 | <b>– 0</b> %  |         |
| 542 |           | 24-PUERTAS CORTAFUEGO   | 3 días   | vie 29/04/22 | mar 03/05/22 | M 0%  |         |
| 543 |           | PUERTA CORTAFUEGO ESTANDAR  | 3 días   | vie 29/04/22 | mar 03/05/22 | <b>■</b> 0%   |         |
| 544 |           | 25-HERRERIA Y ACERO INOXIDABLE                                    | 300 días | jue 25/03/21 | mié 18/05/22 | 0%  |         |
| 545 | s/0000S.S | s/0000S.S.2 - Elementos varios Herreria Paquetes 2 y 4 de ing     | 10 días  | mar 19/04/22 | lun 02/05/22 | ■ 0%  |         |
| 546 | s/0000S.S | s/0000S.S.2 - Baranda de Nucleo de Circulacion Vertical, fachada: | 2 días   | jue 25/03/21 | vie 26/03/21 |   |         |
| 547 | s/000S.S. | s/000S.S.1 - Baranda de Nucleo de Circulacion Vertical, fachadas  | 2 días   | lun 29/03/21 | mar 30/03/21 | 0%  |         |
| 548 | s/00P.B.  | s/00P.B Elementos varios Herreria Paquetes 2 y 4 de ing           | 10 días  | jue 05/05/22 | mié 18/05/22 | ■ 0%  |         |
|     | s/00P.B.  | s/00P.B Baranda de Nucleo de Circulacion Vertical, fachadas y     |          | mié 31/03/21 | jue 01/04/21 | 0%  |         |
|     | s/00P.B.  |   | 10 días  | jue 05/05/22 | mié 18/05/22 | - 0%  |         |
| 551 |           | S/01 – Baranda de Nucleo de Circulacion Vertical, fachadas y balo |          | vie 02/04/21 | lun 05/04/21 | _ 0%  |         |
| 552 |           | S/02 - Baranda de Nucleo de Circulacion Vertical, fachadas y bal  |          | mar 06/04/21 | mié 07/04/21 | ı, <b>0</b> %   |         |
| 553 |           | S/03 - Baranda de Nucleo de Circulacion Vertical, fachadas y bal  |          | jue 22/04/21 | vie 23/04/21 | , <b>0</b> %  |         |
|     | s/04      | S/04 - Baranda de Nucleo de Circulacion Vertical, fachadas y bal  |          | lun 10/05/21 |              | 0%  |         |
| 555 |           | S/05 - Baranda de Nucleo de Circulación Vertical, fachadas y bal  |          | mié 26/05/21 | jue 27/05/21 | , 0%  |         |
| 556 |           | S/06 - Baranda de Nucleo de Circulación Vertical, fachadas y bal  |          | vie 11/06/21 | lun 14/06/21 | , <b>0</b> %  |         |
| 557 |           | S/07 - Baranda de Nucleo de Circulación Vertical, fachadas y bal  |          | mar 29/06/21 | mié 30/06/21 | 1,0%  |         |
|     |           | ·   |          |              |              | 1,0%  |         |
| 558 |           | S/08 - Baranda de Nucleo de Circulación Vertical, fachadas y bal  |          | jue 15/07/21 | vie 16/07/21 | , 0%  |         |
| 559 |           | S/09 - Baranda de Nucleo de Circulación Vertical, fachadas y bal  |          | lun 02/08/21 | mar 03/08/21 |   |         |
| 560 |           | S/10 - Baranda de Nucleo de Circulación Vertical, fachadas y balo |          | mié 18/08/21 | jue 19/08/21 | 1, 0%   |         |
| 561 |           | S/11 - Baranda de Nucleo de Circulación Vertical, fachadas y balo |          | vie 03/09/21 | lun 06/09/21 | 1, 0%   |         |
| 562 |           | S/12 - Baranda de Nucleo de Circulacion Vertical, fachadas y bali |          | mar 21/09/21 | mié 22/09/21 | 1, 0%   |         |
| 563 |           | S/13 - Baranda de Nucleo de Circulacion Vertical, fachadas y bali |          | jue 07/10/21 | vie 08/10/21 | 1,0%  |         |
| 564 |           | S/14 - Baranda de Nucleo de Circulacion Vertical, fachadas y bal  |          | lun 25/10/21 | mar 26/10/21 | ı, 0%   |         |
| 565 |           | S/15 - Baranda de Nucleo de Circulacion Vertical, fachadas y bal  |          | mié 10/11/21 | jue 11/11/21 | 1,0%  |         |
| 566 |           | S/16 - Baranda de Nucleo de Circulacion Vertical, fachadas y bal  |          | vie 26/11/21 | lun 29/11/21 | , 0%  |         |
|     | s/17      | S/17 - Baranda de Nucleo de Circulacion Vertical, fachadas y bal  |          | mar 14/12/21 | mié 15/12/21 | 1, 0%   |         |
| 568 | s/18      | S/18 - Baranda de Nucleo de Circulacion Vertical, fachadas y bal  | 2 días   | vie 31/12/21 | lun 03/01/22 | <b>□, 0%</b>  |         |
| 569 | s/Terraza | s/Terraza - Elementos varios Herreria Paquetes 2 y 4 de ing       | 10 días  | mar 26/04/22 | lun 09/05/22 | ■ 0%  |         |
| 570 |           |   | 24 días  | mié 04/05/22 | lun 06/06/22 | <b>□</b> 0%   |         |
| 571 |           | MANIJON + MANIJA PARA PUERTAS DE ACCESO EN DEPTOS                 | 5 días   | mar 31/05/22 | lun 06/06/22 | ■ 0%  |         |
| 572 |           | CIERRAPUERTAS HIDRAULICO AEREO PARA PUERTAS CORTAFUEGO            | 5 días   | mié 04/05/22 | mar 10/05/22 | ■ 0%  |         |

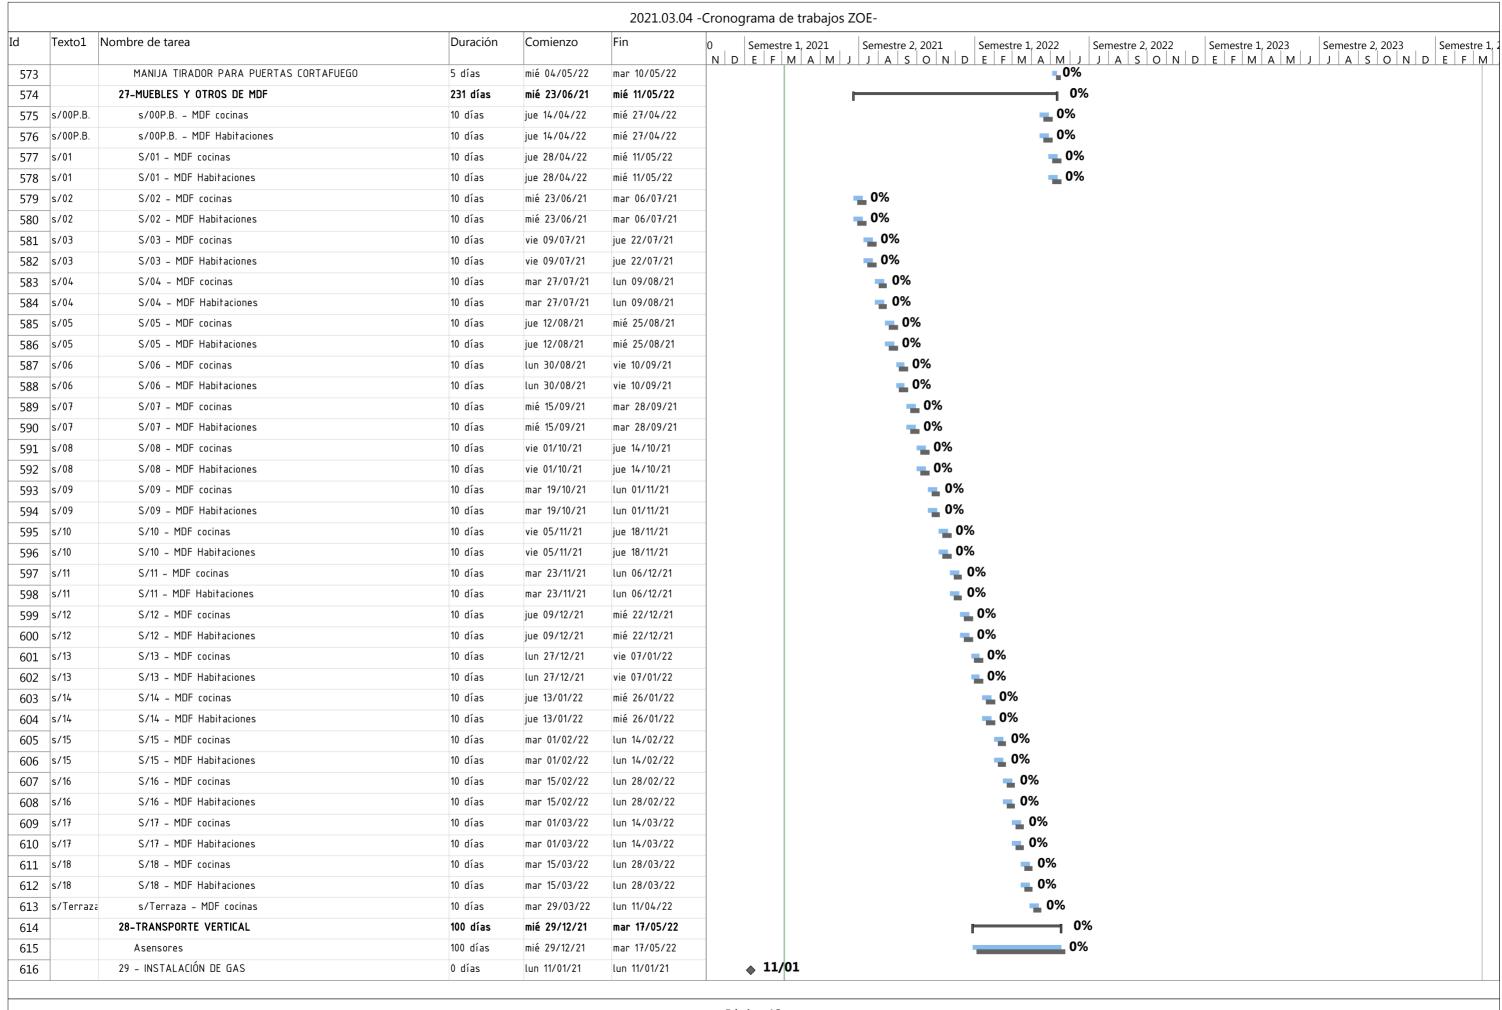

| d   | Texto1   | Nombre de tarea                   | Duración | Comienzo     | Fin          | 0   Semestre 1, 2021   Semestre 2, 2021   Semestre 1, 2022   Semestre 2, 2022   Semestre 1, 2023   Semestre 2, 2023   Semestre 1 |
|-----|----------|-----------------------------------|----------|--------------|--------------|--|
| 617 |          | 30-INSTALACIÓN SANITARIA Y BOMBAS | 341 días | jue 04/02/21 | jue 26/05/22 | N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M  |
| 618 | s/00P.B. | s/00P.B. – Pases en losa          | 2 días   | jue 04/02/21 | vie 05/02/21 | 100%   |
| 619 | s/00P.B. | s/00P.B. – Interconexiones        | 6 días   | jue 31/03/22 | jue 07/04/22 | - 0%   |
| 620 | s/00P.B. | s/00P.B Instalacion Artefactos    | 6 días   | jue 14/04/22 | jue 21/04/22 | <b>■ 0</b> %   |
| 621 | s/01     | s/01 – Pases en losa              | 1 día    | vie 26/02/21 | sáb 27/02/21 | 0%   |
| 622 | s/01     | S/01 - Interconexiones            | 6 días   | jue 07/04/22 | jue 14/04/22 | ■ 0%   |
| 623 | s/01     | S/01 - Instalacion Artefactos     | 6 días   | vie 22/04/22 | vie 29/04/22 | ■ 0%   |
| 624 | s/02     | s/02 – Pases en losa              | 1 día    | mar 16/03/21 | mar 16/03/21 | ı, <b>0%</b>   |
| 625 | s/02     | S/02 - Interconexiones            | 6 días   | mar 08/06/21 | mar 15/06/21 | ■ 0%   |
| 626 | s/02     | S/02 - Instalacion Artefactos     | 6 días   | mié 23/06/21 | mié 30/06/21 | ■ 0%   |
| 627 | s/03     | s/03 – Pases en losa              | 1 día    | jue 01/04/21 | jue 01/04/21 | ı, <b>0</b> %  |
| 628 | s/03     | S/03 - Interconexiones            | 6 días   | jue 24/06/21 | jue 01/07/21 | ■ 0%   |
| 629 | s/03     | S/03 - Instalacion Artefactos     | 6 días   | vie 09/07/21 | vie 16/07/21 | <b>™</b> 0%  |
| 630 | s/04     | s/04 – Pases en losa              | 1 día    | lun 19/04/21 | lun 19/04/21 | ', <b>0</b> %  |
| 631 | s/04     | S/04 - Interconexiones            | 6 días   | lun 12/07/21 | lun 19/07/21 | ■ 0%   |
| 632 | s/04     | S/04 - Instalacion Artefactos     | 6 días   | mar 27/07/21 | mar 03/08/21 | ■ 0%   |
| 633 | s/05     | s/05 – Pases en losa              | 1 día    | mié 05/05/21 | mié 05/05/21 | ı, <b>0%</b>   |
| 634 | s/05     | S/05 - Interconexiones            | 6 días   | mié 28/07/21 | mié 04/08/21 | <b>■</b> 0%  |
| 635 | s/05     | S/05 - Instalacion Artefactos     | 6 días   | jue 12/08/21 | jue 19/08/21 | ■ 0%   |
| 636 | s/06     | s/06 – Pases en losa              | 1 día    | vie 21/05/21 | vie 21/05/21 | · , <b>0</b> %   |
| 637 | s/06     | S/06 - Interconexiones            | 6 días   | vie 13/08/21 | vie 20/08/21 | ■ 0%   |
| 638 | s/06     | S/06 - Instalacion Artefactos     | 6 días   | lun 30/08/21 | lun 06/09/21 | ■ 0%   |
| 639 | s/07     | s/07 – Pases en losa              | 1 día    | mar 08/06/21 | mar 08/06/21 | ı, <b>0%</b>   |
| 640 | s/07     | S/07 - Interconexiones            | 6 días   | mar 31/08/21 | mar 07/09/21 | - 0%   |
| 641 | s/07     | S/07 - Instalacion Artefactos     | 6 días   | mié 15/09/21 | mié 22/09/21 | ■ 0%   |
| 642 | s/08     | s/08 – Pases en losa              | 1 día    | vie 25/06/21 | vie 25/06/21 | ı, <b>0</b> %  |
| 643 | s/08     | S/08 - Interconexiones            | 6 días   | jue 16/09/21 | jue 23/09/21 | ■ 0%   |
| 644 | s/08     | S/08 - Instalacion Artefactos     | 6 días   | vie 01/10/21 | vie 08/10/21 | <b>■ 0</b> %   |
| 645 | s/09     | s/09 – Pases en losa              | 1 día    | lun 12/07/21 | lun 12/07/21 | ı, <b>0</b> %  |
| 646 | s/09     | S/09 - Interconexiones            | 6 días   | lun 04/10/21 | lun 11/10/21 | ■ 0%   |
| 647 | s/09     | S/09 - Instalacion Artefactos     | 6 días   | mar 19/10/21 | mar 26/10/21 | ■ 0%   |
| 648 | s/10     | s/10 – Pases en losa              | 1 día    | mié 28/07/21 | mié 28/07/21 | ı, <b>0</b> %  |
| 649 | s/10     | S/10 - Interconexiones            | 6 días   | jue 21/10/21 | jue 28/10/21 | <b>■</b> 0%  |
| 650 | s/10     | S/10 - Instalacion Artefactos     | 6 días   | vie 05/11/21 | vie 12/11/21 | - 0%   |
| 651 | s/11     | s/11 - Pases en losa              | 1 día    | vie 13/08/21 | vie 13/08/21 | ı, <b>0%</b>   |
| 652 | s/11     | S/11 - Interconexiones            | 6 días   | lun 08/11/21 | lun 15/11/21 | ■ 0%   |
| 653 | s/11     | S/11 – Instalacion Artefactos     | 6 días   | mar 23/11/21 | mar 30/11/21 | ■ 0%   |
| 654 | s/12     | s/12 – Pases en losa              | 1 día    | mar 31/08/21 | mar 31/08/21 | ı, <b>0</b> %  |
| 655 | s/12     | S/12 - Interconexiones            | 6 días   | mié 24/11/21 | mié 01/12/21 | ■ 0%   |
| 656 | s/12     | S/12 - Instalacion Artefactos     | 6 días   | jue 09/12/21 | jue 16/12/21 | ■ 0%   |
| 657 | s/13     | s/13 – Pases en losa              | 1 día    | jue 16/09/21 | jue 16/09/21 | ı, <b>0</b> %  |
| 658 | s/13     | S/13 - Interconexiones            | 6 días   | vie 10/12/21 | vie 17/12/21 | ■ 0%   |
| 659 | s/13     | S/13 - Instalacion Artefactos     | 6 días   | lun 27/12/21 | lun 03/01/22 | ■ 0%   |
| 660 | s/14     | S/14 – Pases en losa              | 1 día    | lun 04/10/21 | lun 04/10/21 | ', <b>0</b> %  |

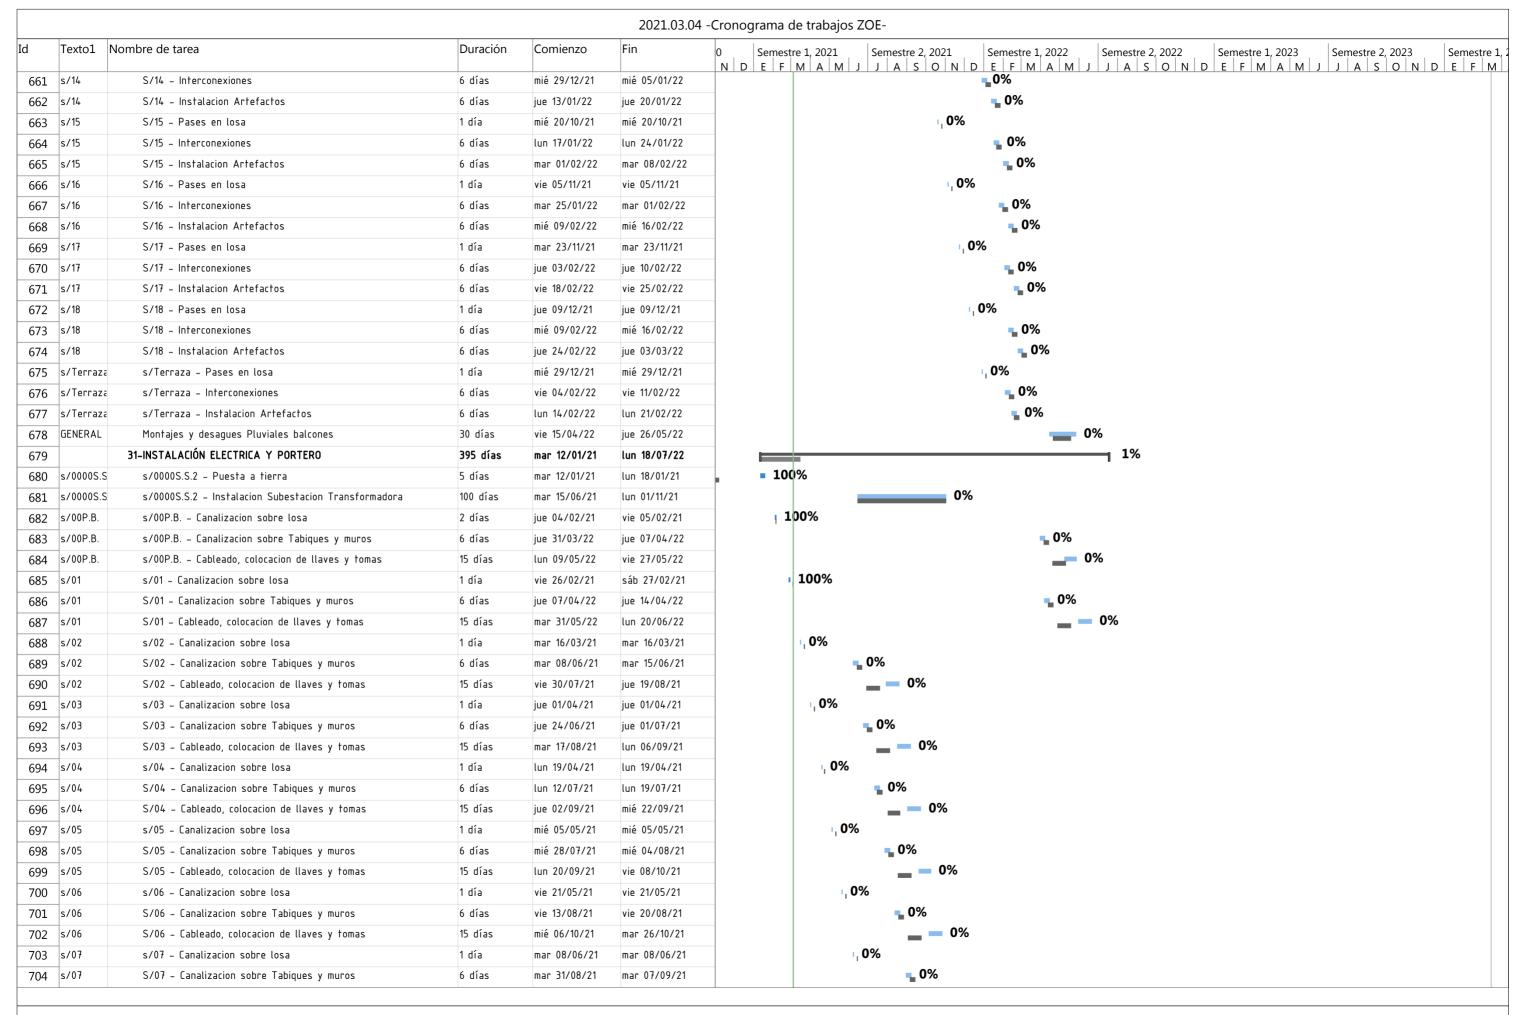

| d - | Texto1    | Nombre de tarea                                    | Duración | Comienzo     | Fin          | 0   Semestre 1, 2021   Semestre 2, 2021   Semestre 1, 2022   Semestre 2, 2022   Semestre 1, 2023   Semestre 2, 2023   Semestre 1 |
|-----|-----------|--|----------|--------------|--------------|--|
|     |           |  |          |              |              | N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M                        |
| 705 |           | S/07 - Cableado, colocacion de llaves y tomas      | 15 días  | vie 22/10/21 | jue 11/11/21 | 0%   |
|     | s/08      | s/08 - Canalizacion sobre losa                     | 1 día    | vie 25/06/21 | vie 25/06/21 | 1, 0%  |
|     | s/08      | S/08 - Canalizacion sobre Tabiques y muros         | 6 días   | jue 16/09/21 | jue 23/09/21 | 0%   |
|     | s/08      | S/08 - Cableado, colocacion de llaves y tomas      | 15 días  | mar 09/11/21 | lun 29/11/21 | 0%   |
|     | s/09      | s/09 - Canalizacion sobre losa                     | 1 día    | lun 12/07/21 | lun 12/07/21 | ı, <b>0</b> %  |
|     | s/09      | S/09 - Canalizacion sobre Tabiques y muros         | 6 días   | lun 04/10/21 | lun 11/10/21 | ■ 0%   |
| 711 |           | S/09 - Cableado, colocacion de llaves y tomas      | 15 días  | jue 25/11/21 | mié 15/12/21 | 0%   |
| 712 |           | s/10 - Canalizacion sobre losa                     | 1 día    | mié 28/07/21 | mié 28/07/21 | 0%   |
| 713 |           | S/10 – Canalizacion sobre Tabiques y muros         | 6 días   | jue 21/10/21 | jue 28/10/21 | 0%   |
| 714 |           | S/10 - Cableado, colocacion de llaves y tomas      | 15 días  | mar 14/12/21 | lun 03/01/22 | 0%   |
| 715 |           | s/11 – Canalizacion sobre losa                     | 1 día    | vie 13/08/21 | vie 13/08/21 | ı, <b>0</b> %  |
| 716 | s/11      | S/11 - Canalizacion sobre Tabiques y muros         | 6 días   | lun 08/11/21 | lun 15/11/21 | ■ 0%   |
| 717 |           | S/11 – Cableado, colocacion de llaves y tomas      | 15 días  | jue 30/12/21 | mié 19/01/22 | 0%   |
| 718 | s/12      | s/12 – Canalizacion sobre losa                     | 1 día    | mar 31/08/21 | mar 31/08/21 | ', <b>0%</b>   |
| 719 | s/12      | S/12 – Canalizacion sobre Tabiques y muros         | 6 días   | mié 24/11/21 | mié 01/12/21 | ■ 0%   |
| 720 | s/12      | S/12 – Cableado, colocacion de llaves y tomas      | 15 días  | lun 17/01/22 | vie 04/02/22 | 0%   |
| 721 | s/13      | s/13 – Canalizacion sobre losa                     | 1 día    | jue 16/09/21 | jue 16/09/21 | ı, <b>0%</b>   |
| 722 | s/13      | S/13 – Canalizacion sobre Tabiques y muros         | 6 días   | vie 10/12/21 | vie 17/12/21 | <b>■</b> 0%  |
| 723 | s/13      | S/13 – Cableado, colocacion de llaves y tomas      | 15 días  | mié 02/02/22 | mar 22/02/22 | 0%   |
| 724 | s/14      | S/14 – Canalizacion sobre losa                     | 1 día    | lun 04/10/21 | lun 04/10/21 | ı, <b>0</b> %  |
| 725 | s/14      | S/14 – Canalizacion sobre Tabiques y muros         | 6 días   | mié 29/12/21 | mié 05/01/22 | <b>■</b> 0%  |
| 726 | s/14      | S/14 – Cableado, colocacion de llaves y tomas      | 15 días  | lun 21/02/22 | vie 11/03/22 | 0%   |
| 727 | s/15      | S/15 – Canalizacion sobre losa                     | 1 día    | mié 20/10/21 | mié 20/10/21 | ı, <b>0</b> %  |
| 728 | s/15      | S/15 - Canalizacion sobre Tabiques y muros         | 6 días   | lun 17/01/22 | lun 24/01/22 | ■ 0%   |
| 729 | s/15      | S/15 - Cableado, colocacion de llaves y tomas      | 15 días  | jue 10/03/22 | mié 30/03/22 | _ 0%   |
| 730 | s/16      | S/16 – Canalizacion sobre losa                     | 1 día    | vie 05/11/21 | vie 05/11/21 | ı, <b>0</b> %  |
| 731 | s/16      | S/16 - Canalizacion sobre Tabiques y muros         | 6 días   | mar 25/01/22 | mar 01/02/22 | ■ 0%   |
| 732 | s/16      | S/16 - Cableado, colocacion de llaves y tomas      | 15 días  | mié 23/03/22 | mar 12/04/22 | 0%   |
| 733 | s/17      | S/17 – Canalizacion sobre losa                     | 1 día    | mar 23/11/21 | mar 23/11/21 | ı, <b>0</b> %  |
| 734 | s/17      | S/17 - Canalizacion sobre Tabiques y muros         | 6 días   | jue 03/02/22 | jue 10/02/22 | ■ 0%   |
| 735 | s/17      | S/17 - Cableado, colocacion de llaves y tomas      | 15 días  | lun 04/04/22 | vie 22/04/22 | 0%   |
| 736 | s/18      | S/18 – Canalizacion sobre losa                     | 1 día    | jue 09/12/21 | jue 09/12/21 | ı, <b>0</b> %  |
| 737 | s/18      | S/18 – Canalizacion sobre Tabiques y muros         | 6 días   | mié 09/02/22 | mié 16/02/22 | <b>■ 0</b> %   |
| 738 | s/18      | S/18 – Cableado, colocacion de llaves y tomas      | 15 días  | vie 15/04/22 | jue 05/05/22 | 0%   |
| 739 | s/Terraza | s/Terraza - Canalizacion sobre losa                | 1 día    | mié 29/12/21 | mié 29/12/21 | ı, <b>0</b> %  |
| 740 | s/Terraza | s/Terraza - Canalizacion sobre Tabiques y muros    | 6 días   | vie 04/02/22 | vie 11/02/22 | ■ 0%   |
| 741 | s/Terraza | s/Terraza - Cableado, colocacion de llaves y tomas | 15 días  | lun 14/02/22 | vie 04/03/22 | <b>0</b> %   |
| 742 | GENEAL    | ZOE – PORTERO ELÉCTRICO                            | 5 días   | lun 20/06/22 | vie 24/06/22 | ■ 0%   |
| 743 | GENEAL    | ZOE - COLECTORES SOLARES                           | 15 días  | lun 07/03/22 | vie 25/03/22 | <b>— 0</b> %   |
| 744 | GENEAL    | ZOE – ACOMETIDA ELECTRICA                          | 10 días  | mar 02/11/21 | lun 15/11/21 | <b>= 0%</b>  |
| 745 | GENEAL    | ZOE - BALIZAMIENTO                                 | 10 días  | lun 21/03/22 | vie 01/04/22 | <b>= 0</b> %   |
|     | GENEAL    | ZOE - DESCARGAS ATMOSFERICAS ZOE                   | 10 días  | lun 07/03/22 | vie 18/03/22 | <b>= 0</b> %   |
|     | GENERAL   | Montajes Electricos canalizacion y cableado        | 20 días  | mar 21/06/22 | lun 18/07/22 | 0%   |
| 748 |           | 32-INSTALACIÓN TERMOMECANICA                       | 222 días | mar 08/06/21 | mié 13/04/22 | 0%   |

| d   | Texto1    | Nombre de tarea                                   | Duración | Comienzo     | Fin          | 0   Semestre 1, 2021   Semestre 2, 2021   Semestre 1, 2022   Semestre 2, 2022   Semestre 1, 2023   Semestre 2, 2023   Semestre 1, 2023   Semestre 2, 2023   Semestre |
|-----|-----------|---|----------|--------------|--------------|---|
| 740 | s/00P.B.  | s/00P.B Pre instalacion Aire Acondicionados       | 5 días   | jue 31/03/22 | mié 06/04/22 | N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M   |
|     | s/01      | S/01 - Pre instalación Aire Acondicionados        | 5 días   | jue 07/04/22 | mié 13/04/22 | ■ 0%  |
|     | s/02      | S/02 - Pre instalación Aire Acondicionados        | 4 días   | mar 08/06/21 | vie 11/06/21 | 0%  |
|     | s/03      | S/03 - Pre instalación Aire Acondicionados        | 4 días   | jue 24/06/21 | mar 29/06/21 | ■ 0%  |
| 753 |           | S/04 - Pre instalación Aire Acondicionados        | 4 días   | lun 12/07/21 | jue 15/07/21 | ■ 0%  |
|     | s/05      | S/05 - Pre instalación Aire Acondicionados        | 4 días   | mié 28/07/21 | lun 02/08/21 | <b>0</b> %  |
| 755 |           | S/06 - Pre instalación Aire Acondicionados        | 4 días   | vie 13/08/21 | mié 18/08/21 | ■ 0%  |
|     | s/07      | S/07 - Pre instalación Aire Acondicionados        | 4 días   | mar 31/08/21 | vie 03/09/21 | □ 0%  |
|     | s/08      | S/08 - Pre instalación Aire Acondicionados        | 4 días   | jue 16/09/21 | mar 21/09/21 | ■ 0%  |
| 758 |           | S/09 - Pre instalación Aire Acondicionados        | 4 días   | lun 04/10/21 | jue 07/10/21 | ■ 0%  |
|     | s/10      | S/10 - Pre instalación Aire Acondicionados        | 4 días   | jue 21/10/21 | mar 26/10/21 | ■ 0%  |
|     |           | S/11 - Pre instalación Aire Acondicionados        |          |              |              |   |
| 760 |           |   | 4 días   | lun 08/11/21 | jue 11/11/21 | <b>□ 0%</b>   |
|     | s/12      | S/12 - Pre instalacion Aire Acondicionados        | 4 días   | mié 24/11/21 | lun 29/11/21 | ■ 0%<br>■ 0%  |
|     | s/13      | S/13 - Pre instalacion Aire Acondicionados        | 4 días   | vie 10/12/21 | mié 15/12/21 | <b>"_ 0%</b>  |
| 763 |           | S/14 - Pre instalacion Aire Acondicionados        | 4 días   | mié 29/12/21 | lun 03/01/22 | <b>0%</b>   |
|     | s/15      | S/15 - Pre instalacion Aire Acondicionados        | 4 días   | lun 17/01/22 | jue 20/01/22 | <b>□ 0%</b>   |
| 765 |           | S/16 - Pre instalacion Aire Acondicionados        | 3 días   | mar 25/01/22 | jue 27/01/22 | ı, 0%   |
|     | s/17      | S/17 - Pre instalacion Aire Acondicionados        | 4 días   | jue 03/02/22 | mar 08/02/22 | <b>" 0%</b>   |
|     | s/18      | S/18 - Pre instalacion Aire Acondicionados        | 4 días   | mié 09/02/22 | lun 14/02/22 | ■ 0%  |
| 768 |           | 33-PROYECTOS ESPECIALES                           | 10 días  | lun 02/05/22 | vie 13/05/22 | <b>™</b> 0%   |
| 769 |           | EQUIPAMIENTO LAUNDRY                              | 10 días  | lun 02/05/22 | vie 13/05/22 | <b>- 0</b> %  |
| 770 |           | PROYECTOS ESPECIALES (CAMARAS+INTERNET)           | 10 días  | lun 02/05/22 | vie 13/05/22 | <b>- 0</b> %  |
| 771 |           | PERGOLA SOLAR                                     | 10 días  | lun 02/05/22 | vie 13/05/22 | <b>- 0</b> %  |
| 772 |           | ARMARIO COMUNITARIO                               | 10 días  | lun 02/05/22 | vie 13/05/22 | <b>- 0</b> %  |
| 773 |           | 34-INSTALACIÓN DE DEFENSA CONTRA INCENDIO         | 38 días  | mar 22/02/22 | jue 14/04/22 | <b>□</b> 0%   |
| 774 | s/0000S.S | s/0000S.S.2 - Instalacion Cañeria Contra Incendio | 10 días  | mar 22/02/22 | lun 07/03/22 | ■ 0%  |
| 775 | s/000S.S. | s/000S.S.1 - Instalacion Cañeria Contra Incendio  | 10 días  | vie 04/03/22 | jue 17/03/22 | ■ 0%  |
| 776 | GENERAL   | Ejecucion de montantes en nucleo de cañerias      | 15 días  | vie 18/03/22 | jue 07/04/22 | ■ 0%  |
| 777 | GENERAL   | Instalacion de matafuegos y accesorios            | 5 días   | vie 08/04/22 | jue 14/04/22 | ■ 0%  |
| 778 |           | 35-PINTURA, LACA Y OTRAS TERMINACIONES            | 233 días | mié 21/07/21 | vie 10/06/22 | 0%  |
| 779 | s/00P.B.  | s/00P.B Pintura Interior                          | 10 días  | jue 28/04/22 | mié 11/05/22 | ■ 0%  |
| 780 | s/00P.B.  | s/00P.B Pintura en aberturas                      | 4 días   | lun 09/05/22 | jue 12/05/22 | <b>□</b> 0%   |
| 781 | s/00P.B.  | s/00P.B. – Laca Hormigon                          | 6 días   | jue 12/05/22 | jue 19/05/22 | <b>□ 0</b> %  |
| 782 | s/01      | s/01 - Pintura Interior                           | 10 días  | vie 20/05/22 | jue 02/06/22 | ■ 0%  |
| 783 | s/01      | S/01 - Pintura en aberturas                       | 4 días   | mar 31/05/22 | vie 03/06/22 | <b>□</b> 0%   |
| 784 | s/01      | S/01 – Laca Hormigon                              | 6 días   | vie 03/06/22 | vie 10/06/22 | ■ 0%  |
| 785 | s/02      | s/02 - Pintura Interior                           | 10 días  | mié 21/07/21 | mar 03/08/21 | <b>■ 0</b> %  |
| 786 | s/02      | S/02 - Pintura en aberturas                       | 4 días   | vie 30/07/21 | mié 04/08/21 | <b>□ 0</b> %  |
| 787 | s/02      | S/02 - Laca Hormigon                              | 6 días   | mié 04/08/21 | mié 11/08/21 | ■ 0%  |
| 788 |           | s/03 - Pintura Interior                           | 10 días  | vie 06/08/21 | jue 19/08/21 | <b>—</b> 0%   |
| 789 |           | S/03 - Pintura en aberturas                       | 4 días   | mar 17/08/21 | vie 20/08/21 | □ 0%  |
| 790 |           | S/03 - Laca Hormigon                              | 6 días   | vie 20/08/21 | vie 27/08/21 | ■ 0%  |
| 791 |           | s/04 - Pintura Interior                           | 10 días  | mar 24/08/21 | lun 06/09/21 | 0%  |
| 792 |           | S/04 - Pintura en aberturas                       | 4 días   | jue 02/09/21 | mar 07/09/21 | 0%  |

|     |          |                             |          |              | 2021.03.04   |
|-----|----------|-----------------------------|----------|--------------|--------------|
|     | Texto1   | Nombre de tarea             | Duración | Comienzo     | Fin          |
| 793 | s/04     | S/04 - Laca Hormigon        | 6 días   | mar 07/09/21 | mar 14/09/21 |
| 794 | s/05     | s/05 - Pintura Interior     | 10 días  | jue 09/09/21 | mié 22/09/21 |
| 795 | s/05     | S/05 - Pintura en aberturas | 4 días   | lun 20/09/21 | jue 23/09/21 |
| 796 | s/05     | S/05 - Laca Hormigon        | 6 días   | jue 23/09/21 | jue 30/09/21 |
| 797 | s/06     | s/06 - Pintura Interior     | 10 días  | lun 27/09/21 | vie 08/10/21 |
| 798 | s/06     | S/06 - Pintura en aberturas | 4 días   | mié 06/10/21 | lun 11/10/21 |
| 799 | s/06     | S/06 - Laca Hormigon        | 6 días   | lun 11/10/21 | lun 18/10/21 |
| 800 | s/07     | s/07 - Pintura Interior     | 10 días  | mié 13/10/21 | mar 26/10/21 |
| 801 | s/07     | S/07 - Pintura en aberturas | 4 días   | vie 22/10/21 | mié 27/10/21 |
| 802 | s/07     | S/07 - Laca Hormigon        | 6 días   | mié 27/10/21 | mié 03/11/21 |
| 803 | s/08     | s/08 - Pintura Interior     | 10 días  | vie 29/10/21 | jue 11/11/21 |
| 804 | s/08     | S/08 - Pintura en aberturas | 4 días   | mar 09/11/21 | vie 12/11/21 |
| 805 | s/08     | S/08 – Laca Hormigon        | 6 días   | vie 12/11/21 | vie 19/11/21 |
| 806 | s/09     | s/09 - Pintura Interior     | 10 días  | mar 16/11/21 | lun 29/11/21 |
| 807 | s/09     | S/09 - Pintura en aberturas | 4 días   | jue 25/11/21 | mar 30/11/21 |
| 808 | s/09     | S/09 – Laca Hormigon        | 6 días   | mar 30/11/21 | mar 07/12/21 |
| 809 | s/10     | s/10 - Pintura Interior     | 10 días  | vie 03/12/21 | jue 16/12/21 |
| 810 | s/10     | S/10 - Pintura en aberturas | 4 días   | mar 14/12/21 | vie 17/12/21 |
| 811 | s/10     | S/10 – Laca Hormigon        | 6 días   | vie 17/12/21 | vie 24/12/21 |
| 812 | s/11     | s/11 - Pintura Interior     | 10 días  | mar 21/12/21 | lun 03/01/22 |
| 813 | s/11     | S/11 - Pintura en aberturas | 4 días   | jue 30/12/21 | mar 04/01/22 |
| 814 | s/11     | S/11 – Laca Hormigon        | 6 días   | mar 04/01/22 | mar 11/01/22 |
| 815 | s/12     | s/12 - Pintura Interior     | 10 días  | jue 06/01/22 | mié 19/01/22 |
| 316 | s/12     | S/12 - Pintura en aberturas | 4 días   | lun 17/01/22 | jue 20/01/22 |
| 317 | s/12     | S/12 - Laca Hormigon        | 6 días   | jue 20/01/22 | jue 27/01/22 |
| 318 | s/13     | s/13 - Pintura Interior     | 10 días  | lun 24/01/22 | vie 04/02/22 |
|     | s/13     | S/13 - Pintura en aberturas | 4 días   | mié 02/02/22 | lun 07/02/22 |
| 820 |          | S/13 – Laca Hormigon        | 6 días   | lun 07/02/22 | lun 14/02/22 |
|     | s/14     | S/14 - Pintura Interior     | 10 días  | jue 10/02/22 | mié 23/02/22 |
| 822 |          | S/14 - Pintura en aberturas | 4 días   | lun 21/02/22 | jue 24/02/22 |
| 823 |          | S/14 – Laca Hormigon        | 6 días   | jue 24/02/22 | jue 03/03/22 |
| 824 |          | S/15 - Pintura Interior     | 10 días  | mar 01/03/22 | lun 14/03/22 |
| 825 |          | S/15 - Pintura en aberturas | 4 días   | jue 10/03/22 | mar 15/03/22 |
| 826 |          | S/15 – Laca Hormigon        | 6 días   | mar 15/03/22 | mar 22/03/22 |
| 827 |          | S/16 - Pintura Interior     | 10 días  | mié 09/03/22 | mar 22/03/22 |
| 828 | -        | S/16 - Pintura en aberturas | 4 días   | mié 23/03/22 | lun 28/03/22 |
| 829 |          | S/16 - Laca Hormigon        | 6 días   | mié 23/03/22 | mié 30/03/22 |
| 830 |          | S/17 - Pintura Interior     | 10 días  | vie 18/03/22 | jue 31/03/22 |
| 831 |          | S/17 - Pintura en aberturas | 4 días   | lun 04/04/22 | jue 07/04/22 |
| 832 |          | S/17 - Laca Hormigon        | 6 días   | vie 01/04/22 | vie 08/04/22 |
| 833 |          | S/18 - Pintura Interior     | 10 días  | jue 24/03/22 | mié 06/04/22 |
| 834 | -        | S/18 - Pintura en aberturas | 4 días   | vie 15/04/22 | mié 20/04/22 |
| 835 |          | S/18 - Laca Hormigon        | 6 días   | jue 07/04/22 | jue 14/04/22 |
|     | s/Terra: |                             | 10 días  | jue 17/02/22 | mié 02/03/22 |

|     |           |  |          |              | 2021.03.04   | ograma de trabajos ZOE-  |
|-----|-----------|--|----------|--------------|--------------|--|
| d   | Texto1 I  | Nombre de tarea                          | Duración | Comienzo     | Fin          | Semestre 1, 2021   Semestre 2, 2021   Semestre 1, 2022   Semestre 2, 2022   Semestre 1, 2023   Semestre 2, 2023   Semestre 2, 2023   Semestre 2, 2024   Semestre 2, 2025   Semestre 2, 2026   Semestre 2, 2026   Semestre 2, 2027   Semestre 2, 2027   Semestre 2, 2028   Semestre 2, |
| 837 | s/Terraza | s/Terraza - Pintura en aberturas         | 4 días   | jue 03/03/22 | mar 08/03/22 | <b>₽</b> 0%  |
| 838 | s/Terraza | s/Terraza - Laca Hormigon                | 6 días   | jue 03/03/22 | jue 10/03/22 | <b>₽</b> 0%  |
| 839 |           | 36-EQUIPAMIENTO, JARDINERIA Y SEÑALETICA | 94 días  | lun 25/04/22 | jue 01/09/22 | 0%   |
| 840 |           | SEÑALETICA DE SS                         | 20 días  | lun 25/04/22 | vie 20/05/22 | _ <b>0</b> %   |
| 841 |           | NUMEROS EN PALIERES                      | 5 días   | lun 23/05/22 | vie 27/05/22 | . □ 0%   |
| 842 |           | JARDINERIA                               | 7 días   | lun 20/06/22 | mar 28/06/22 | <b>= 0%</b>  |
| 843 |           | OBRAS DE ARTE                            | 7 días   | lun 20/06/22 | mar 28/06/22 | <b>= 0%</b>  |
| 844 |           | EQUIPAMIENTO HALL DE ACCESO + PATIOS     | 7 días   | lun 20/06/22 | mar 28/06/22 | <b>= 0%</b>  |
| 845 |           | NUMEROS EN PUERTAS                       | 10 días  | mar 31/05/22 | lun 13/06/22 | <b>– 0</b> %   |
| 846 |           | COPIA DE LLAVES PARA PROPIETARIOS        | 5 días   | vie 26/08/22 | jue 01/09/22 | <b>0%</b>  |
| 847 |           | 37-POSTVENTA                             | 417 días | mié 10/08/22 | jue 14/03/24 |  |
| 848 |           | POSTVENTA-PRE ENTREGA                    | 17 días  | mié 10/08/22 | jue 01/09/22 | 0%   |
| 849 |           | POSTVENTA-POST ENTREGA                   | 400 días | vie 02/09/22 | jue 14/03/24 |  |
